




Tâche	Durée	Début	Fin	ST	%	Points d'attention	
0 CITY DOX - Phase 1 - Planning amont et exécution détaillé	541 days	Wed 01-06-16	Fri 14-09-18				
1 INSTALLATIONS DE CHANTIER	335 days	Mon 22-08-16	Tue 23-01-18		0%		
2 Jalons clés et interfaces	0 days	Mon 22-08-16	Mon 22-08-16		0%		
3 Démarrage des travaux	0 days	Mon 22-08-16	Mon 22-08-16		0%		Démarrage des travaux ◆ 22-08
4 Etudes et achats	33 days	Tue 15-11-16	Mon 09-01-17		0%		
5 Etudes	23 days	Tue 15-11-16	Fri 16-12-16		0%		
6 GT3 - Plans et note de calcul fondation	10 days	Fri 02-12-16	Fri 16-12-16		0%	Coordination avec BET structure	GT3 - Plans et note de calcul fondation
7 GT4 - Plans et note de calcul fondation	10 days	Tue 15-11-16	Tue 29-11-16		0%	Coordination avec BET structure	GT4 - Plans et note de calcul fondation
8 Achats	23 days	Tue 29-11-16	Mon 09-01-17		0%		
9 GT3 - Commande grue	10 days	Fri 16-12-16	Mon 09-01-17		0%	Réactions grue à déterminer	GT3 - Commande grue
10 GT4 - Commande grue	10 days	Tue 29-11-16	Tue 13-12-16		0%	Réactions grue à déterminer	GT4 - Commande grue
11 Exécution grues à tour	257 days	Tue 13-12-16	Tue 23-01-18		0%		
12 Fondations	18 days	Tue 13-12-16	Fri 13-01-17		0%		
13 GT3 - Fondation	5 days	Mon 09-01-17	Fri 13-01-17		0%		GT3 - Fondation
14 GT4 - Fondation	8 days	Tue 13-12-16	Thu 22-12-16		0%		GT4 - Fondation
15 Montage	15 days	Mon 09-01-17	Fri 27-01-17		0%		
16 GT3 - Montage	5 days	Mon 23-01-17	Fri 27-01-17		0%		GT3 - Montage
17 GT4 - Montage	5 days	Mon 09-01-17	Fri 13-01-17		0%		GT4 - Montage
18 Démontage	10 days	Wed 10-01-18	Tue 23-01-18		0%		
19 GT3 - Démontage	5 days	Wed 10-01-18	Tue 16-01-18		0%		GT3 - Démontage
20 GT4 - Démontage	5 days	Wed 17-01-18	Tue 23-01-18		0%		GT4 - Démontage
21 ABORDS ET JARDINS	370 days	Mon 09-01-17	Fri 10-08-18		0%		
22 Exécution	370 days	Mon 09-01-17	Fri 10-08-18		0%		
23 Zone B	355 days	Mon 09-01-17	Fri 29-06-18		0%		
24 Évacuation des Terres Polluées	25 days	Mon 09-01-17	Fri 10-02-17		0%		
25 Evacuation de la totalité des terres polluées	25 days	Mon 09-01-17	Fri 10-02-17		0%		Evacuation de la totalité des terres polluées
26 Réseaux et drainage	35 days	Fri 23-02-18	Wed 11-04-18		0%		
27 Creusement et comblement des tranchées communes	15 days	Fri 02-03-18	Thu 22-03-18		0%		Creusement et comblement des tranchées communes
28 Collecteurs eaux pluviales, eaux usées et ouvrages annexes	15 days	Fri 23-03-18	Wed 11-04-18		0%		Collecteurs eaux pluviales, eaux usées et ouvrages annexes
29 Bassins d'orage enterrés	15 days	Fri 23-02-18	Thu 15-03-18		0%		Bassins d'orage enterrés
30 Travaux de revêtements	35 days	Fri 30-03-18	Mon 21-05-18		0%		
31 Revêtements	20 days	Thu 19-04-18	Mon 21-05-18		0%		Revêtements
32 Éléments linéaires	20 days	Fri 30-03-18	Thu 26-04-18		0%		Éléments linéaires
33 Mobilier urbain	10 days	Tue 05-06-18	Mon 18-06-18		0%		
34 Arceaux, bornes, bancs, clôtures, lattes occultantes	10 days	Tue 05-06-18	Mon 18-06-18		0%		Arceaux, bornes, bancs, clôtures, lattes occultantes
35 Eclairage et signalisation	45 days	Thu 05-04-18	Mon 11-06-18		0%		
36 Gaines et câblages	20 days	Thu 05-04-18	Fri 04-05-18		0%		Gaines et câblages
37 Bornes et spots d'éclairage	15 days	Tue 22-05-18	Mon 11-06-18		0%		Bornes et spots d'éclairage
38 Plantation	29 days	Tue 22-05-18	Fri 29-06-18		0%		
39 Nappage de terre végétales	10 days	Tue 22-05-18	Mon 04-06-18		0%		Nappage de terre végétales
40 Plantation et semis	20 days	Mon 04-06-18	Fri 29-06-18		0%		Plantation et semis
41 Travaux sur Dalle	89 days	Fri 23-02-18	Fri 29-06-18		0%		
42 Travaux de préparation + Etanchéité	40 days	Fri 23-02-18	Wed 18-04-18		0%		Travaux de préparation + Etanchéité
43 Plantation et Semis	15 days	Mon 11-06-18	Fri 29-06-18		0%		Plantation et Semis
44 Auto-contrôle, pré-réception interne Abords et jardin	0 days	Fri 10-08-18	Fri 10-08-18		0%		Auto-contrôle, pré-réception interne Abords et jardin ◆ 10-08
45 BATIMENT B1-5	541 days	Wed 01-06-16	Fri 14-09-18		0%		
46 B1-5 - Exécution	450 days	Mon 05-09-16	Thu 09-08-18		0%		

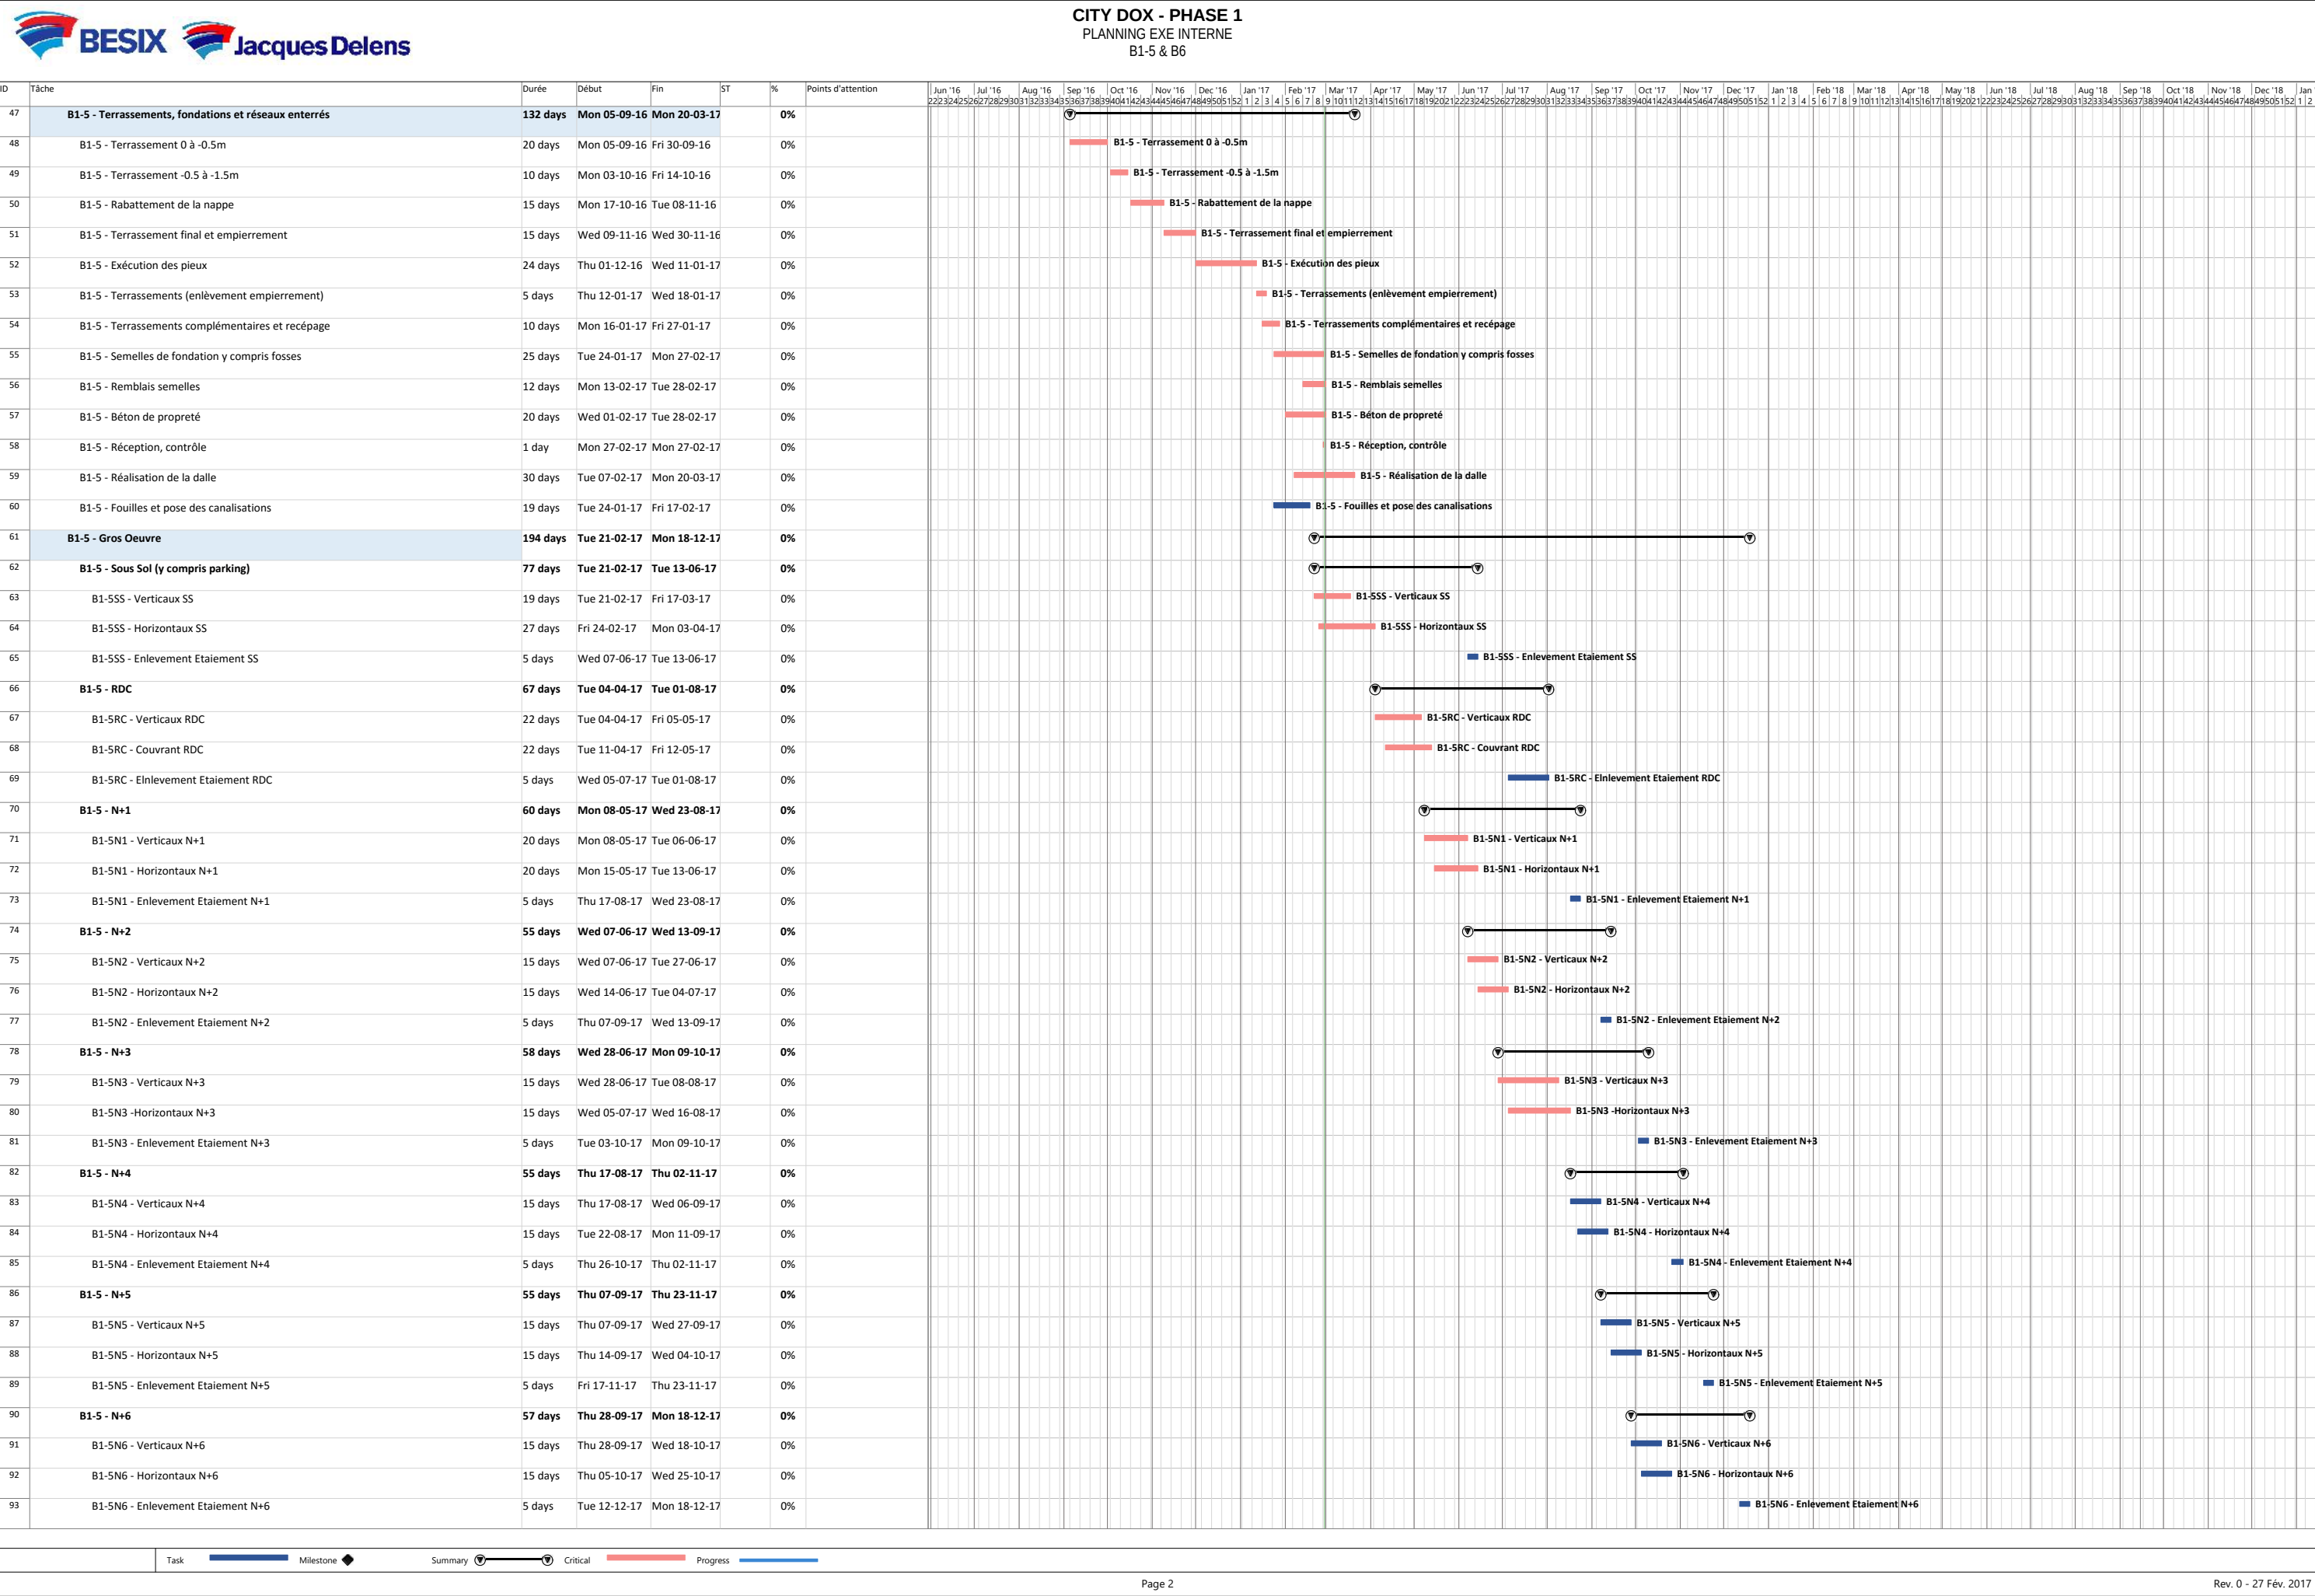


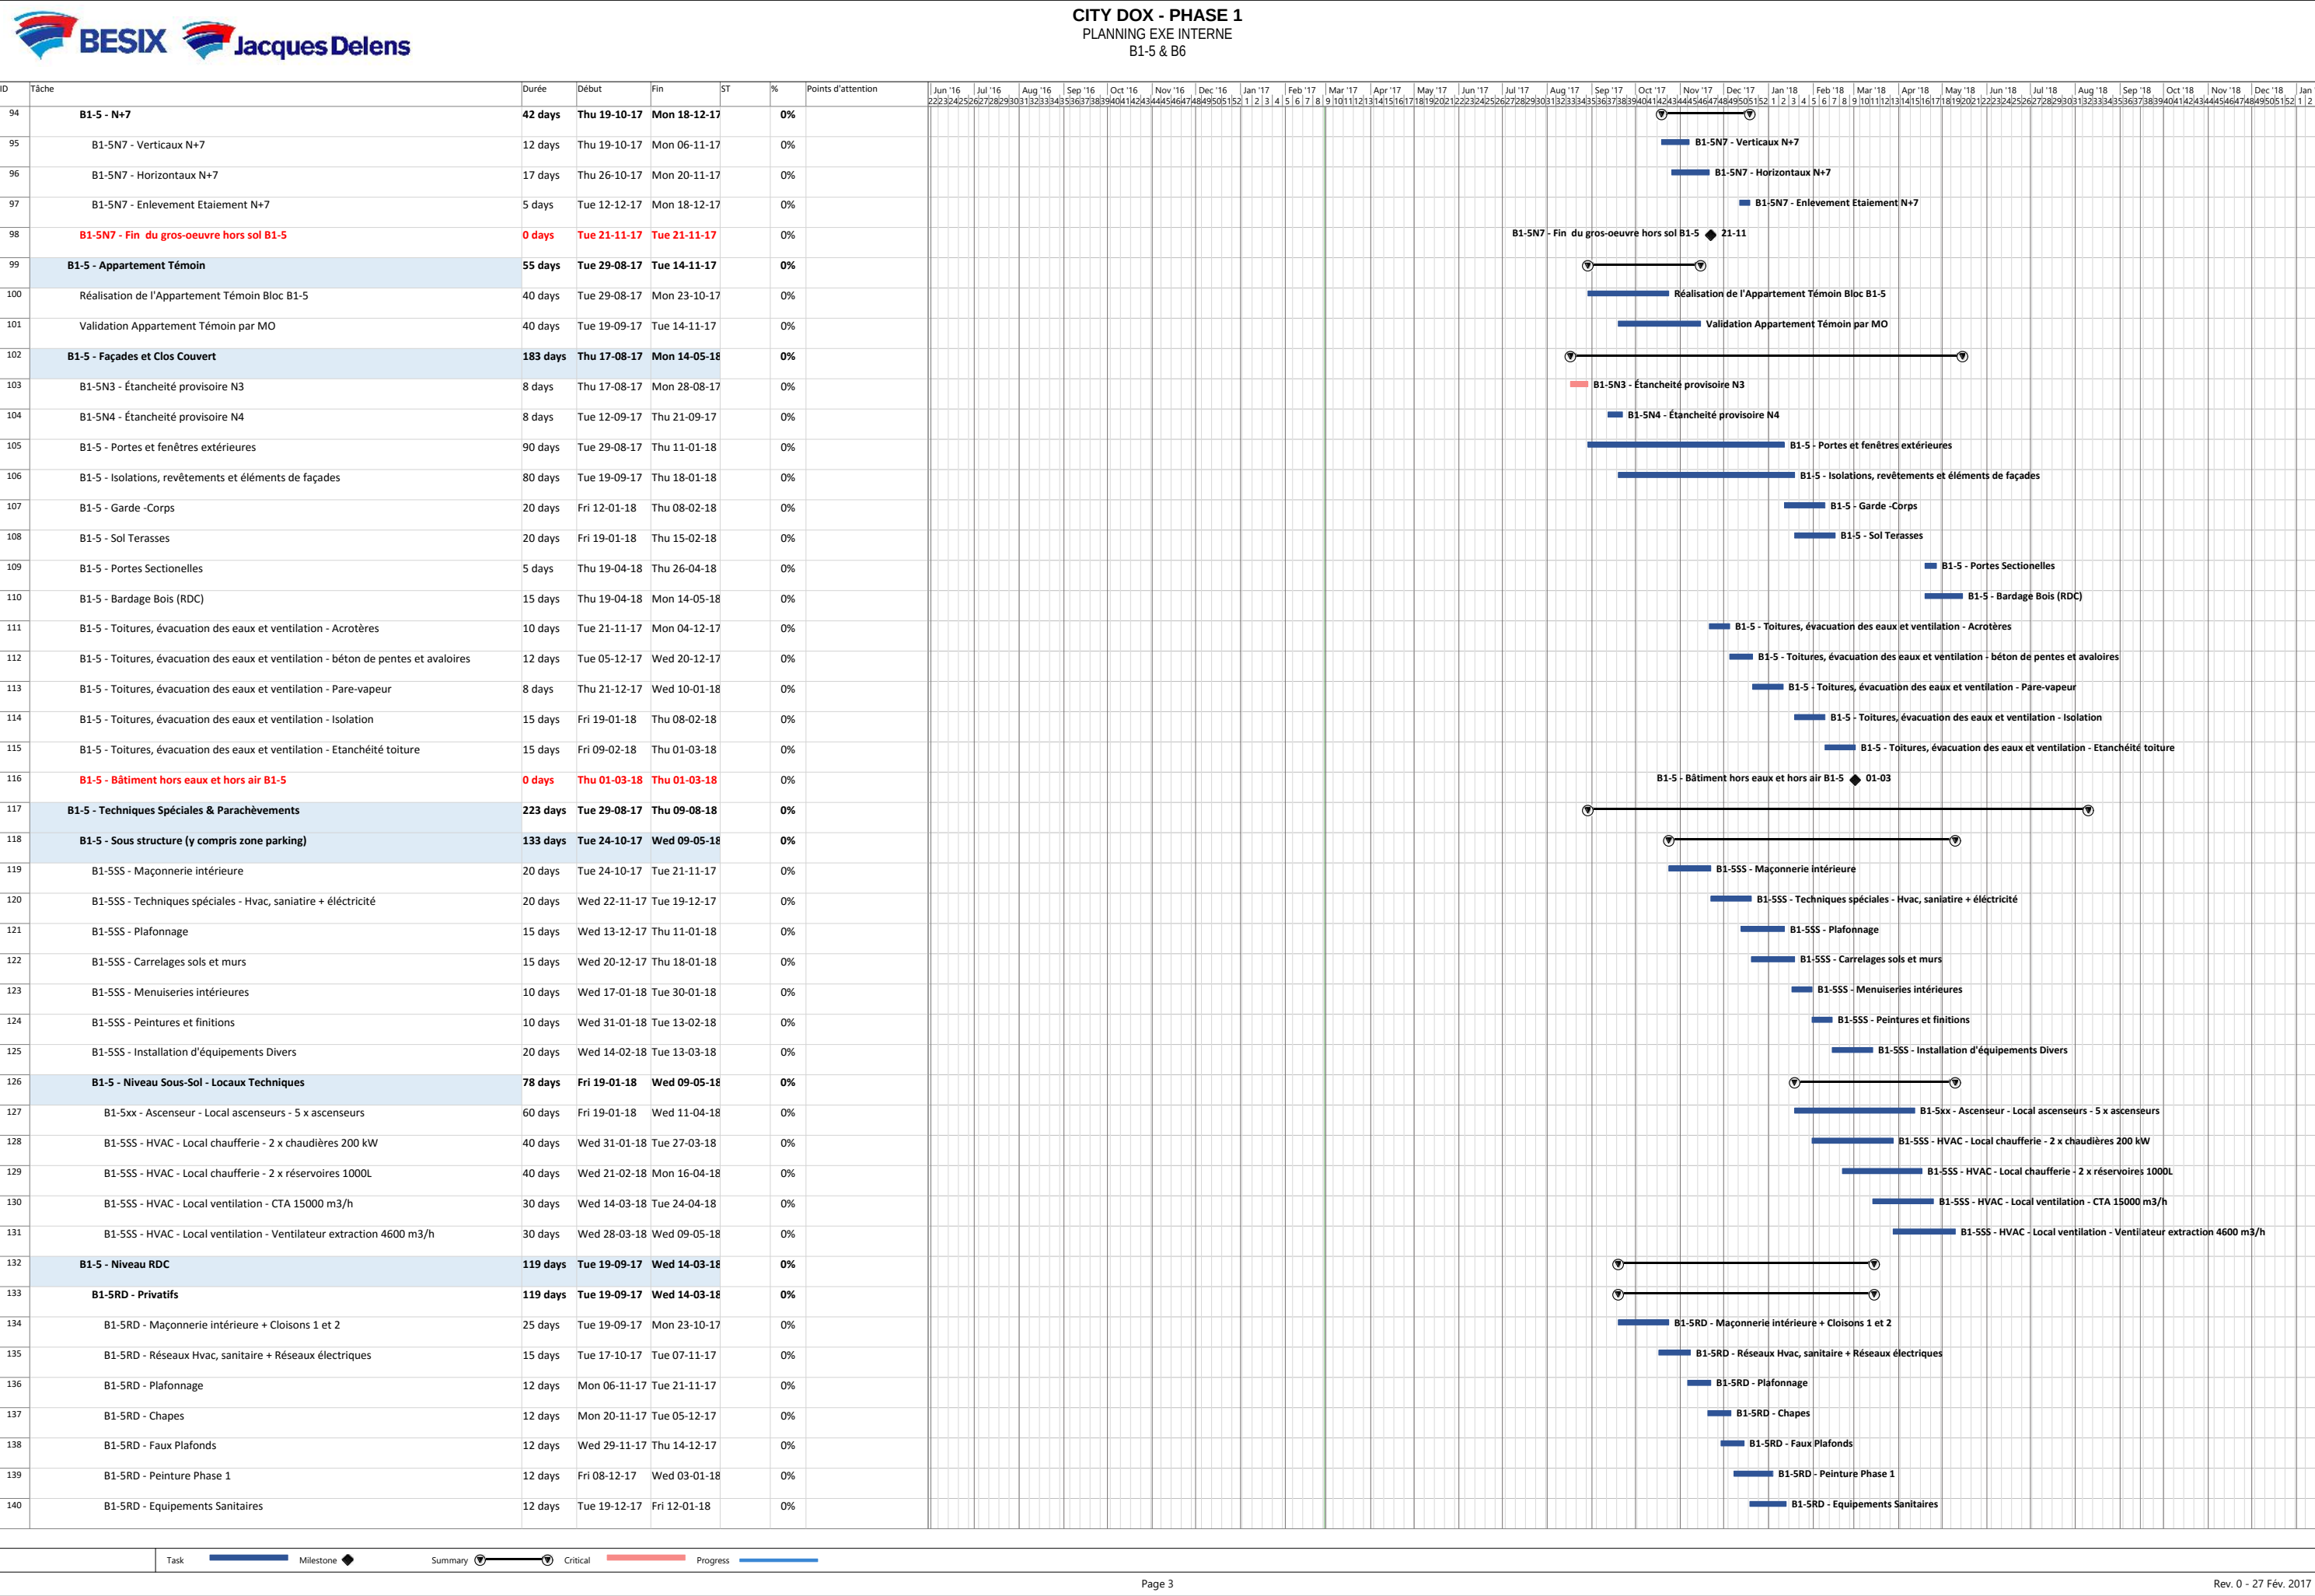

Tâche	Durée	Début	Fin	ST	%	Points d'attention	
141	B1-5RD - Carrelages sols et murs	12 days	Mon 08-01-18	Tue 23-01-18	0%		B1-5RD - Carrelages sols et murs
142	B1-5RD - Menuiseries intérieures (y compris porte palier)	12 days	Wed 17-01-18	Thu 01-02-18	0%		B1-5RD - Menuiseries intérieures (y compris porte palier)
143	B1-5RD - Equipement Hvac, sanitaire + Equipement électrique	12 days	Fri 26-01-18	Mon 12-02-18	0%		B1-5RD - Equipement Hvac, sanitaire + Equipement électrique
144	B1-5RD - Parquets	12 days	Fri 09-02-18	Mon 26-02-18	0%		B1-5RD - Parquets
145	B1-5RD - Peinture Finale + Equipements support	12 days	Tue 27-02-18	Wed 14-03-18	0%		B1-5RD - Peinture Finale + Equipements support
146	B1-5RD - Communs	73 days	Wed 08-11-17	Tue 27-02-18	0%		B1-5RD - Réseaux Plafonds B1-5RD - Réseaux encastrés B1-5RD - Faux plafonds B1-5RD - Parachèvements - Sols B1-5RD - Parachèvements - Murs B1-5RD - Menuiseries y compris meubles
147	B1-5RD - Réseaux Plafonds	8 days	Wed 08-11-17	Fri 17-11-17	0%		
148	B1-5RD - Réseaux encastrés	8 days	Wed 08-11-17	Fri 17-11-17	0%		
149	B1-5RD - Faux plafonds	8 days	Tue 05-12-17	Thu 14-12-17	0%		
150	B1-5RD - Parachèvements - Sols	10 days	Wed 24-01-18	Tue 06-02-18	0%		
151	B1-5RD - Parachèvements - Murs	10 days	Wed 07-02-18	Tue 20-02-18	0%		
152	B1-5RD - Menuiseries y compris meubles	5 days	Wed 21-02-18	Tue 27-02-18	0%		
153	B1-5 - Niveau N1	120 days	Tue 29-08-17	Thu 22-02-18	0%		B1-5N1 - Maçonnerie intérieure - Blocs de Plâtre + Maçonnerie Blocs Béton B1-5N1 - Réseaux Encastrés (Hvac, sanitaire, électriques) + Réseaux Plafond B1-5N1 - Plafonnage B1-5N1 - Chapes étage B1-5N1 - Faux Plafonds B1-5N1 - Equipements Sanitaires B1-5N1 - Carrelages sols et murs B1-5N1 - Menuiseries intérieures (y compris porte palier) B1-5N1 - Equipement Hvac, sanitaire + Equipement électrique B1-5N1 - Parquets B1-5N1 - Peinture Propreté
154	B1-5N1 - Privatifs	109 days	Tue 29-08-17	Wed 07-02-18	0%		
155	B1-5N1 - Maçonnerie intérieure - Blocs de Plâtre + Maçonnerie Blocs Béton	25 days	Tue 29-08-17	Mon 02-10-17	0%		
156	B1-5N1 - Réseaux Encastrés (Hvac, sanitaire, électriques) + Réseaux Plafond	15 days	Tue 19-09-17	Mon 09-10-17	0%		
157	B1-5N1 - Plafonnage	15 days	Thu 28-09-17	Wed 18-10-17	0%		
158	B1-5N1 - Chapes étage	15 days	Mon 09-10-17	Fri 27-10-17	0%		
159	B1-5N1 - Faux Plafonds	15 days	Mon 27-11-17	Fri 15-12-17	0%		
160	B1-5N1 - Equipements Sanitaires	15 days	Wed 06-12-17	Thu 04-01-18	0%		
161	B1-5N1 - Carrelages sols et murs	15 days	Wed 13-12-17	Thu 11-01-18	0%		
162	B1-5N1 - Menuiseries intérieures (y compris porte palier)	15 days	Tue 02-01-18	Mon 22-01-18	0%		
163	B1-5N1 - Equipement Hvac, sanitaire + Equipement électrique	12 days	Thu 11-01-18	Fri 26-01-18	0%		
164	B1-5N1 - Parquets	12 days	Wed 17-01-18	Thu 01-02-18	0%		
165	B1-5N1 - Peinture Propreté	12 days	Tue 23-01-18	Wed 07-02-18	0%		
166	B1-5N1 - Communs	101 days	Mon 25-09-17	Thu 22-02-18	0%		B1-5N1 - Réseaux TS B1-5N1 - Parachèvements - Sols B1-5N1 - Parachèvements - Murs B1-5N1 - Menuiseries
167	B1-5N1 - Réseaux TS	10 days	Mon 25-09-17	Mon 09-10-17	0%		
168	B1-5N1 - Parachèvements - Sols	10 days	Fri 26-01-18	Thu 08-02-18	0%		
169	B1-5N1 - Parachèvements - Murs	10 days	Fri 02-02-18	Thu 15-02-18	0%		
170	B1-5N1 - Menuiseries	5 days	Fri 16-02-18	Thu 22-02-18	0%		
171	B1-5 - Niveau N2	110 days	Tue 03-10-17	Thu 15-03-18	0%		B1-5N2 - Maçonnerie intérieure - Blocs de Plâtre + Maçonnerie Blocs Béton B1-5N2 - Réseaux Encastrés (Hvac, sanitaire, électriques) + Réseaux Plafond B1-5N2 - Plafonnage B1-5N2 - Chapes étage B1-5N2 - Faux Plafonds B1-5N2 - Equipements Sanitaires B1-5N2 - Carrelages sols et murs B1-5N2 - Menuiseries intérieures (y compris porte palier) B1-5N2 - Equipement Hvac, sanitaire + Equipement électrique B1-5N2 - Parquets B1-5N2 - Peinture Propreté
172	B1-5N2 - Privatifs	99 days	Tue 03-10-17	Wed 28-02-18	0%		
173	B1-5N2 - Maçonnerie intérieure - Blocs de Plâtre + Maçonnerie Blocs Béton	25 days	Tue 03-10-17	Tue 07-11-17	0%		
174	B1-5N2 - Réseaux Encastrés (Hvac, sanitaire, électriques) + Réseaux Plafond	15 days	Tue 24-10-17	Tue 14-11-17	0%		
175	B1-5N2 - Plafonnage	15 days	Fri 03-11-17	Thu 23-11-17	0%		
176	B1-5N2 - Chapes étage	15 days	Tue 14-11-17	Mon 04-12-17	0%		
177	B1-5N2 - Faux Plafonds	15 days	Mon 18-12-17	Tue 16-01-18	0%		
178	B1-5N2 - Equipements Sanitaires	15 days	Fri 05-01-18	Thu 25-01-18	0%		
179	B1-5N2 - Carrelages sols et murs	15 days	Fri 12-01-18	Thu 01-02-18	0%		
180	B1-5N2 - Menuiseries intérieures (y compris porte palier)	15 days	Tue 23-01-18	Mon 12-02-18	0%		
181	B1-5N2 - Equipement Hvac, sanitaire + Equipement électrique	12 days	Thu 01-02-18	Fri 16-02-18	0%		
182	B1-5N2 - Parquets	12 days	Wed 07-02-18	Thu 22-02-18	0%		
183	B1-5N2 - Peinture Propreté	12 days	Tue 13-02-18	Wed 28-02-18	0%		
184	B1-5N2 - Communs	91 days	Mon 30-10-17	Thu 15-03-18	0%		B1-5N2 - Réseaux TS B1-5N2 - Parachèvements - Sols B1-5N2 - Parachèvements - Murs
185	B1-5N2 - Réseaux TS	10 days	Mon 30-10-17	Tue 14-11-17	0%		
186	B1-5N2 - Parachèvements - Sols	10 days	Fri 16-02-18	Thu 01-03-18	0%		
187	B1-5N2 - Parachèvements - Murs	10 days	Fri 23-02-18	Thu 08-03-18	0%		

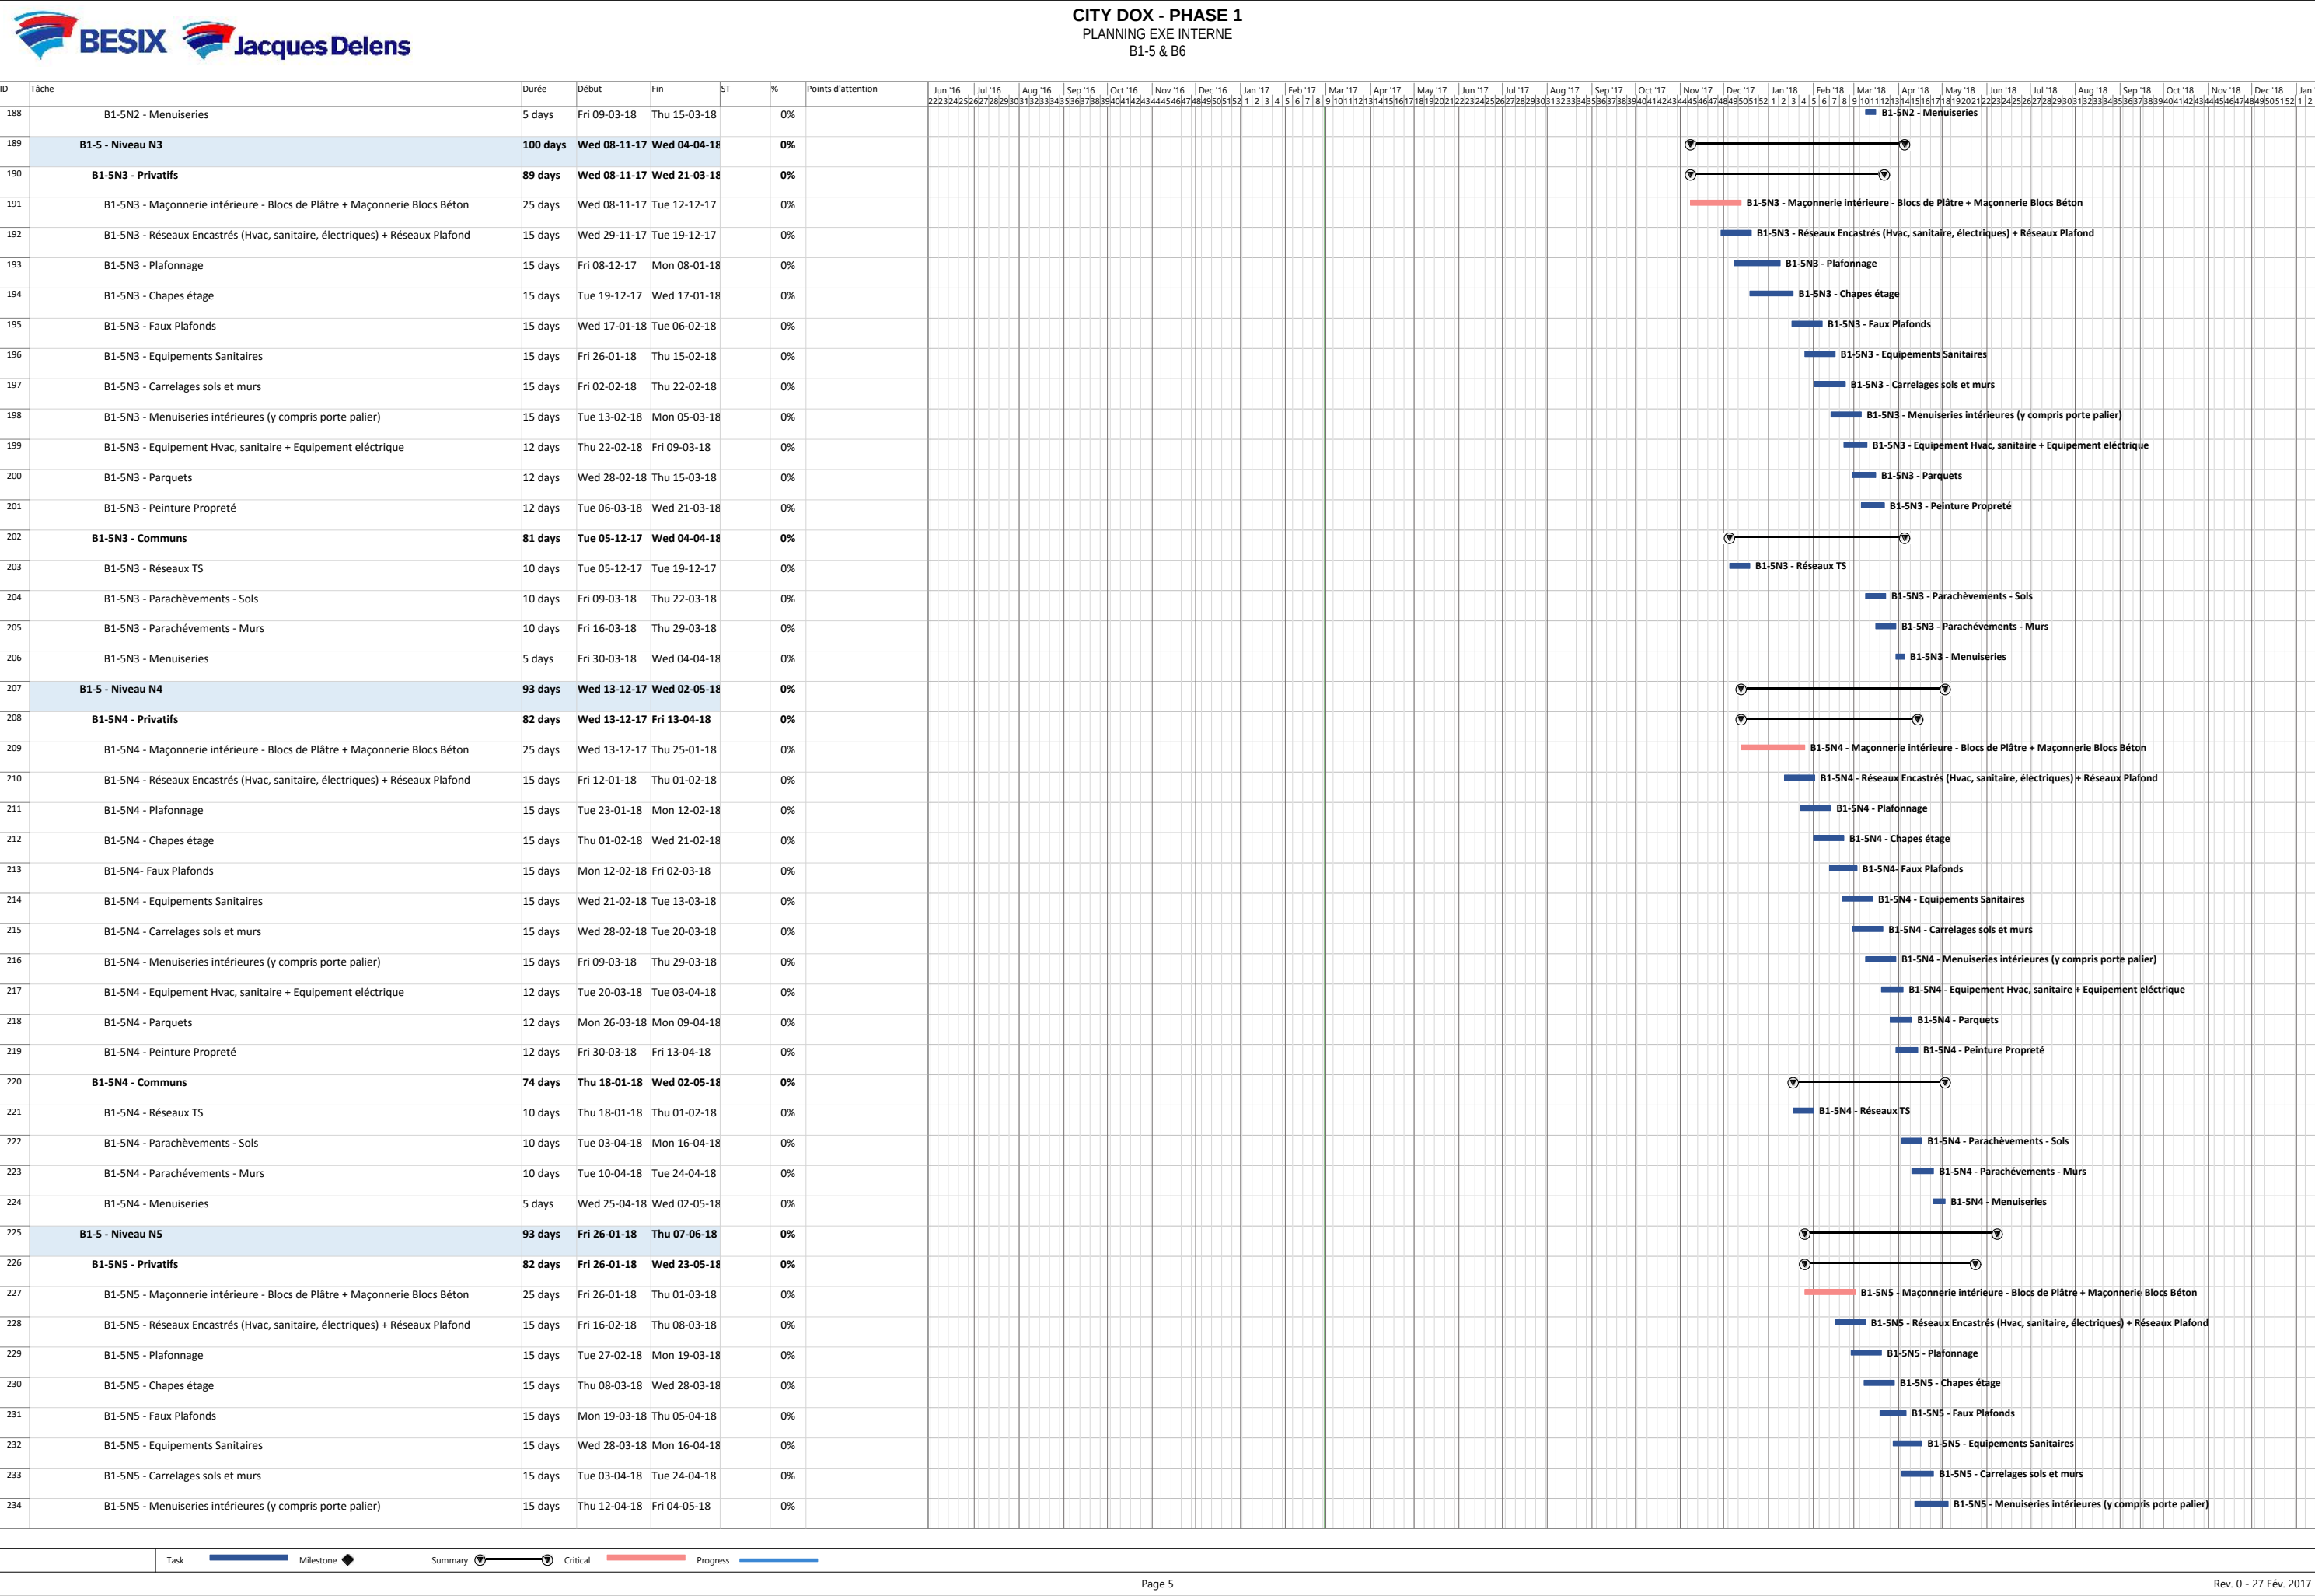

BESIX Jacques Delens		CITY DOX - PHASE 1																																					
		PLANNING EXE INTERNE																																					
		B1-5 & B6																																					
ID	Tâche	Durée	Début	Fin	ST	%	Points d'attention	Jun '16	Jul '16	Aug '16	Sep '16	Oct '16	Nov '16	Dec '16	Jan '17	Feb '17	Mar '17	Apr '17	May '17	Jun '17	Jul '17	Aug '17	Sep '17	Oct '17	Nov '17	Dec '17	Jan '18	Feb '18	Mar '18	Apr '18	May '18	Jun '18	Jul '18	Aug '18	Sep '18	Oct '18	Nov '18	Dec '18	Jan '19
235	B1-SN5 - Equipement Hvac, sanitaire + Equipement électrique	12 days	Tue 24-04-18	Fri 11-05-18		0%																																	
236	B1-SN5 - Parquets	12 days	Mon 30-04-18	Thu 17-05-18		0%																																	
237	B1-SN5 - Peinture Propreté	12 days	Mon 07-05-18	Wed 23-05-18		0%																																	
238	B1-SN5 - Communs	74 days	Thu 22-02-18	Thu 07-06-18		0%																																	
239	B1-SN5 - Réseaux TS	10 days	Thu 22-02-18	Thu 08-03-18		0%																																	
240	B1-SN5 - Parachèvements - Sols	10 days	Fri 11-05-18	Thu 24-05-18		0%																																	
241	B1-SN5 - Parachèvements - Murs	10 days	Fri 18-05-18	Thu 31-05-18		0%																																	
242	B1-SN5 - Menuiseries	5 days	Fri 01-06-18	Thu 07-06-18		0%																																	
243	B1-5 - Niveau N6	93 days	Fri 02-03-18	Thu 02-08-18		0%																																	
244	B1-SN6 - Privatifs	82 days	Fri 02-03-18	Wed 27-06-18		0%																																	
245	B1-SN6 - Maçonnerie intérieure - Blocs de Plâtre + Maçonnerie Blocs Béton	25 days	Fri 02-03-18	Wed 04-04-18		0%																																	
246	B1-SN6 - Réseaux Encastrés (Hvac, sanitaire, électriques) + Réseaux Plafond	15 days	Fri 23-03-18	Wed 11-04-18		0%																																	
247	B1-SN6 - Plafonnage	15 days	Mon 02-04-18	Fri 20-04-18		0%																																	
248	B1-SN6 - Chapes étage	15 days	Wed 11-04-18	Thu 03-05-18		0%																																	
249	B1-SN6 - Faux Plafonds	15 days	Fri 20-04-18	Tue 15-05-18		0%																																	
250	B1-SN6 - Equipements Sanitaires	15 days	Thu 03-05-18	Thu 24-05-18		0%																																	
251	B1-SN6 - Carrelages sols et murs	15 days	Fri 11-05-18	Thu 31-05-18		0%																																	
252	B1-SN6 - Menuiseries intérieures (y compris porte palier)	15 days	Tue 22-05-18	Mon 11-06-18		0%																																	
253	B1-SN6 - Equipement Hvac, sanitaire + Equipement électrique	12 days	Thu 31-05-18	Fri 15-06-18		0%																																	
254	B1-SN6 - Parquets	12 days	Wed 06-06-18	Thu 21-06-18		0%																																	
255	B1-SN6 - Peinture Propreté	12 days	Tue 12-06-18	Wed 27-06-18		0%																																	
256	B1-SN6 - Communs	74 days	Thu 29-03-18	Thu 02-08-18		0%																																	
257	B1-SN6 - Réseaux TS	10 days	Thu 29-03-18	Wed 11-04-18		0%																																	
258	B1-SN6 - Parachèvements - Sols	10 days	Fri 15-06-18	Thu 28-06-18		0%																																	
259	B1-SN6 - Parachèvements - Murs	10 days	Fri 22-06-18	Thu 05-07-18		0%																																	
260	B1-SN6 - Menuiseries	5 days	Fri 06-07-18	Thu 02-08-18		0%																																	
261	B1-5 - Niveau N7	73 days	Thu 05-04-18	Thu 09-08-18		0%																																	
262	B1-SN7 - Privatifs	65 days	Thu 05-04-18	Mon 30-07-18		0%																																	
263	B1-SN7 - Maçonnerie intérieure - Blocs de Plâtre + Maçonnerie Blocs Béton	15 days	Thu 05-04-18	Thu 26-04-18		0%																																	
264	B1-SN7 - Réseaux Encastrés (Hvac, sanitaire, électriques) + Réseaux Plafond	8 days	Thu 19-04-18	Wed 02-05-18		0%																																	
265	B1-SN7 - Plafonnage	8 days	Wed 25-04-18	Mon 07-05-18		0%																																	
266	B1-SN7 - Chapes étage	7 days	Fri 04-05-18	Tue 15-05-18		0%																																	
267	B1-SN7 - Faux Plafonds	8 days	Wed 16-05-18	Fri 25-05-18		0%																																	
268	B1-SN7 - Equipements Sanitaires	8 days	Fri 25-05-18	Tue 05-06-18		0%																																	
269	B1-SN7 - Carrelages sols et murs	8 days	Fri 01-06-18	Tue 12-06-18		0%																																	
270	B1-SN7 - Menuiseries intérieures (y compris porte palier)	8 days	Tue 12-06-18	Thu 21-06-18		0%																																	
271	B1-SN7 - Equipement Hvac, sanitaire + Equipement électrique	8 days	Mon 18-06-18	Wed 27-06-18		0%																																	
272	B1-SN7 - Parquets	8 days	Fri 22-06-18	Tue 03-07-18		0%																																	
273	B1-SN7 - Peinture Propreté	8 days	Thu 28-06-18	Mon 30-07-18		0%																																	
274	B1-SN7 - Communs	59 days	Thu 26-04-18	Thu 09-08-18		0%																																	
275	B1-SN7 - Réseaux TS	5 days	Thu 26-04-18	Fri 04-05-18		0%																																	

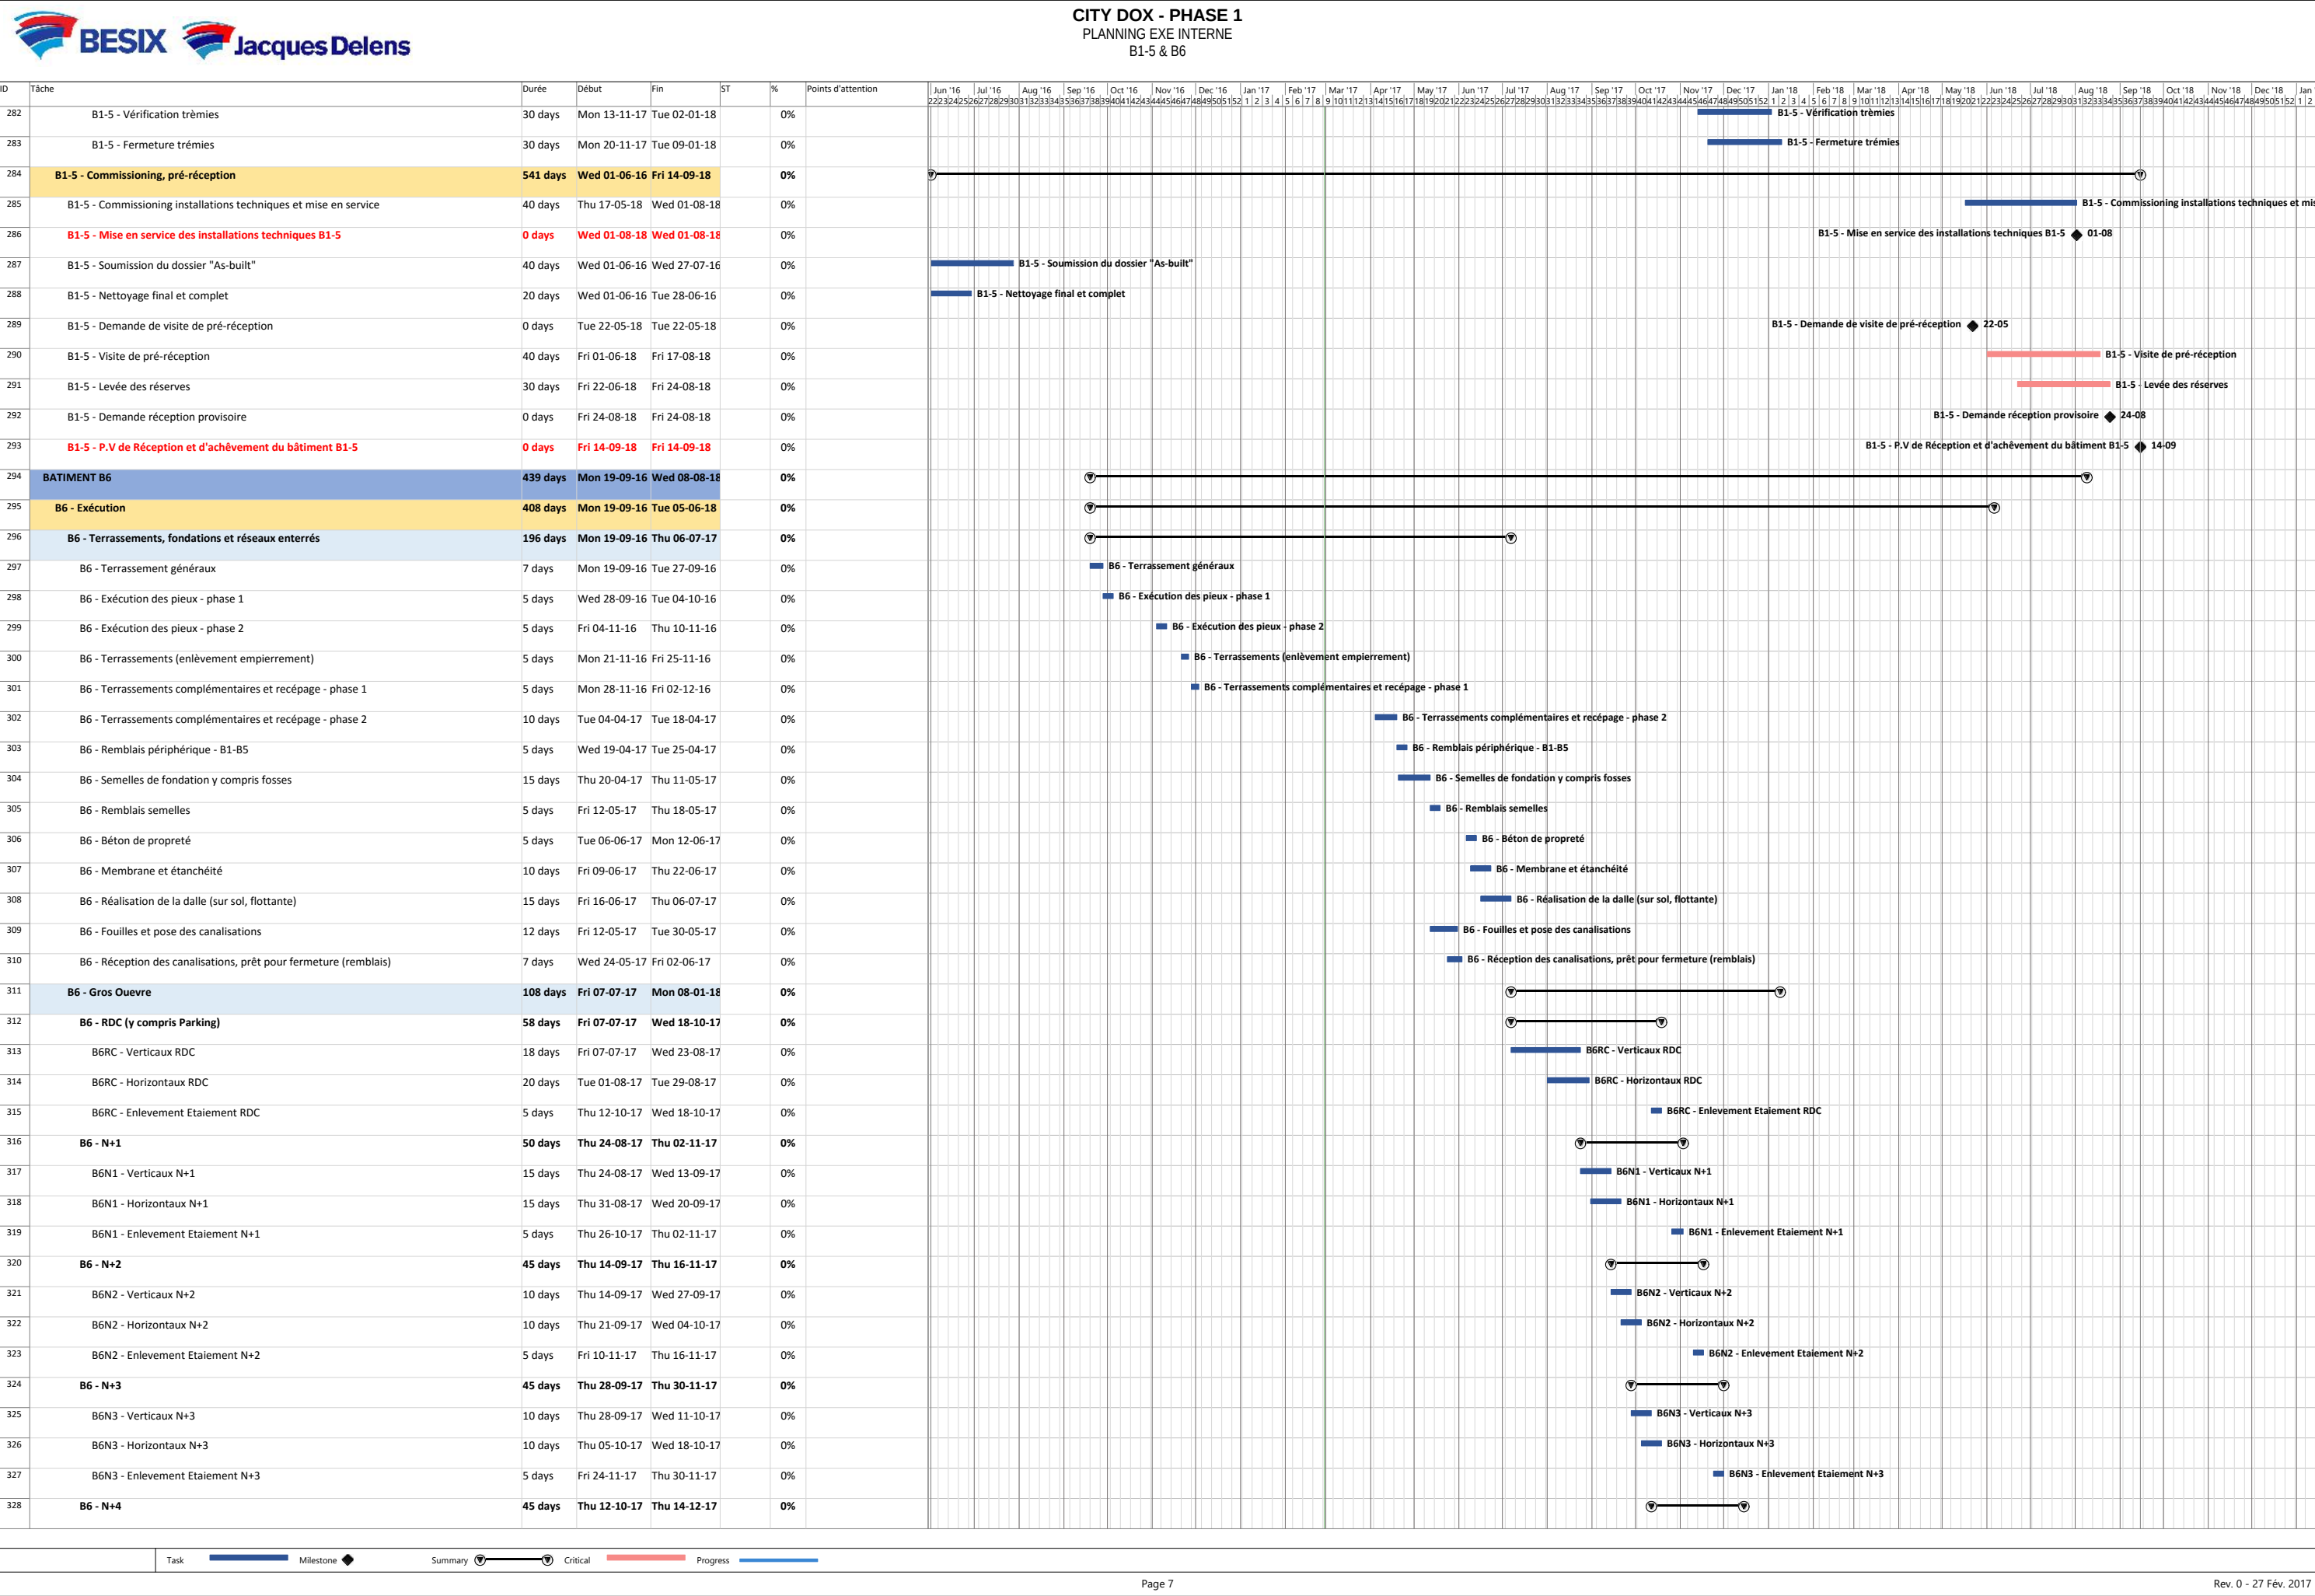

Tâche	Durée	Début	Fin	ST	%	Points d'attention
329	B6N4 - Verticaux N+4	10 days	Thu 12-10-17 Wed 25-10-17		0%	
330	B6N4 - Horizontaux N+4	10 days	Thu 19-10-17 Thu 02-11-17		0%	
331	B6N4 - Enlèvement Etalement N+4	5 days	Fri 08-12-17 Thu 14-12-17		0%	
332	B6 - N+5	45 days	Thu 26-10-17 Mon 08-01-18		0%	
333	B6N5 - Verticaux N+5	10 days	Thu 26-10-17 Thu 09-11-17		0%	
334	B6N5 - Horizontaux N+5	10 days	Fri 03-11-17 Thu 16-11-17		0%	
335	B6N5 - Enlèvement Etalement N+5	5 days	Tue 02-01-18 Mon 08-01-18		0%	
336	B6 - N+6	35 days	Fri 10-11-17 Mon 08-01-18		0%	
337	B6N6 - Verticaux N+6	10 days	Fri 10-11-17 Thu 23-11-17		0%	
338	B6N6 - Horizontaux N+6	10 days	Fri 17-11-17 Thu 30-11-17		0%	
339	B6N6 - Enlèvement Etalement N+6	5 days	Tue 02-01-18 Mon 08-01-18		0%	
340	B6N6 - Fin du gros-oeuvre hors sol B6	0 days	Fri 01-12-17 Fri 01-12-17		0%	
341	B6 - Façades et Clos Couvert	98 days	Thu 19-10-17 Thu 15-03-18		0%	
342	B6N3 - Étanchéité provisoire N3	8 days	Thu 19-10-17 Mon 30-10-17		0%	
343	B6N4 - Étanchéité provisoire N4	8 days	Fri 03-11-17 Tue 14-11-17		0%	
344	B6 - Portes et fenêtres extérieures	70 days	Tue 31-10-17 Thu 15-02-18		0%	
345	B6 - Isolations, revêtements et éléments de façades	60 days	Wed 22-11-17 Thu 22-02-18		0%	
346	B6 - Habillages Métalliques	20 days	Fri 16-02-18 Thu 15-03-18		0%	
347	B6 - Toitures, évacuation des eaux et ventilation - Acrotères	9 days	Wed 06-12-17 Mon 18-12-17		0%	
348	B6 - Toitures, évacuation des eaux et ventilation - béton de pentes et avaloires	10 days	Tue 19-12-17 Wed 10-01-18		0%	
349	B6 - Toitures, évacuation des eaux et ventilation - Pare-vapeur	8 days	Thu 11-01-18 Mon 22-01-18		0%	
350	B6 - Toitures, évacuation des eaux et ventilation - Isolation	12 days	Tue 23-01-18 Wed 07-02-18		0%	
351	B6 - Toitures, évacuation des eaux et ventilation - Etanchéité toiture	15 days	Thu 01-02-18 Wed 21-02-18		0%	
352	B6 - Bâtiment hors eaux et hors air B6	0 days	Wed 21-02-18 Wed 21-02-18		0%	
353	B6 - Techniques Spéciales & Parachèvements	145 days	Thu 02-11-17 Tue 05-06-18		0%	
354	B6 - Niveau RDC (y compris zone parking)	116 days	Wed 13-12-17 Tue 05-06-18		0%	
355	B6 - Maçonnerie intérieure	20 days	Wed 21-02-18 Tue 20-03-18		0%	
356	B6 - Techniques spéciales - Hvac, sanitiare + électricité	20 days	Wed 07-03-18 Mon 02-04-18		0%	
357	B6 - Plafonnage	15 days	Wed 28-03-18 Mon 16-04-18		0%	
358	B6 - Carrelages sols et murs	15 days	Tue 10-04-18 Wed 02-05-18		0%	
359	B6 - Menuiseries intérieures	10 days	Wed 25-04-18 Wed 09-05-18		0%	
360	B6 - Peintures et finitions	10 days	Thu 03-05-18 Thu 17-05-18		0%	
361	B6 - Installation d'équipements Divers	20 days	Tue 08-05-18 Tue 05-06-18		0%	
362	B6RC - Locaux Techniques	60 days	Wed 13-12-17 Thu 15-03-18		0%	
363	B6RC - Ascenseur - Local ascenseurs - 4 x ascenseurs	25 days	Wed 10-01-18 Tue 13-02-18		0%	
364	B6RC - HVAC - Local chaufferie - 2 x réservoirs	30 days	Wed 13-12-17 Thu 01-02-18		0%	
365	B6RC - HVAC - Local ventilation - CTA	25 days	Fri 12-01-18 Thu 15-02-18		0%	
366	B6RC - HVAC - Local ventilation - Ventilateur extraction 5000 m3/h	35 days	Fri 26-01-18 Thu 15-03-18		0%	
367	B6 - Niveau N1	90 days	Thu 02-11-17 Fri 16-03-18		0%	
368	B6N1 - Maçonneries intérieures	12 days	Thu 02-11-17 Fri 17-11-17		0%	
369	B6N1 - Réseaux Hvac, sanitaire + Réseaux électriques	12 days	Mon 13-11-17 Tue 28-11-17		0%	
370	B6N1 - Plafonnage	12 days	Wed 22-11-17 Thu 07-12-17		0%	
371	B6N1 - Faux Plafonds Bureaux - Structure	15 days	Mon 04-12-17 Tue 02-01-18		0%	
372	B6N1 - Chapes	2 days	Fri 08-12-17 Mon 11-12-17		0%	
373	B6N1 - Faux Plafonds Bureaux - Finitions	10 days	Wed 03-01-18 Tue 16-01-18		0%	
374	B6N1 - Faux Plafonds Sanitaires	4 days	Fri 19-01-18 Wed 24-01-18		0%	
375	B6N1 - Carrelages - Sols et Murs	5 days	Thu 25-01-18 Wed 31-01-18		0%	

Tâche	Durée	Début	Fin	ST	%	Points d'attention
376	B6N1 - Menuiseries, portes et fenêtres intérieures	5 days	Thu 01-02-18	Wed 07-02-18	0%	
377	B6N1 - Equipements sanitaires	5 days	Thu 08-02-18	Wed 14-02-18	0%	
378	B6N1 - Peinture Propreté	10 days	Thu 15-02-18	Wed 28-02-18	0%	
379	B6N1 - Faux Plancher	4 days	Thu 01-03-18	Tue 06-03-18	0%	
380	B6N1 - Peinture Final + Finitions	8 days	Wed 07-03-18	Fri 16-03-18	0%	
381	B6 - Niveau N2	86 days	Mon 20-11-17	Wed 28-03-18	0%	
382	B6N2 - Maçonneries intérieures	12 days	Mon 20-11-17	Tue 05-12-17	0%	
383	B6N2 - Réseaux Hvac, sanitaire + Réseaux électriques	12 days	Wed 29-11-17	Thu 14-12-17	0%	
384	B6N2 - Plafonnage	12 days	Fri 08-12-17	Wed 03-01-18	0%	
385	B6N2 - Faux Plafonds Bureaux - Structure	15 days	Wed 20-12-17	Thu 18-01-18	0%	
386	B6N2 - Chapes	2 days	Thu 04-01-18	Fri 05-01-18	0%	
387	B6N2 - Faux Plafonds Bureaux - Finitions	10 days	Fri 19-01-18	Thu 01-02-18	0%	
388	B6N2 - Faux Plafonds Sanitaires	4 days	Fri 26-01-18	Wed 31-01-18	0%	
389	B6N2 - Carrelages - Sols et Murs	5 days	Thu 01-02-18	Wed 07-02-18	0%	
390	B6N2 - Menuiseries, portes et fenêtres intérieures	5 days	Thu 08-02-18	Wed 14-02-18	0%	
391	B6N2 - Equipements sanitaires	5 days	Thu 15-02-18	Wed 21-02-18	0%	
392	B6N2 - Peinture Propreté	10 days	Thu 22-02-18	Wed 07-03-18	0%	
393	B6N2 - Faux Plancher	4 days	Thu 08-03-18	Tue 13-03-18	0%	
394	B6N1 - Peinture Final + Finitions	8 days	Mon 19-03-18	Wed 28-03-18	0%	
395	B6 - Niveau N3	82 days	Wed 06-12-17	Fri 06-04-18	0%	
396	B6N3 - Maçonneries intérieures	12 days	Wed 06-12-17	Thu 21-12-17	0%	
397	B6N3 - Réseaux Hvac, sanitaire + Réseaux électriques	12 days	Fri 15-12-17	Wed 10-01-18	0%	
398	B6N3 - Plafonnage	12 days	Thu 04-01-18	Fri 19-01-18	0%	
399	B6N3 - Faux Plafonds Bureaux - Structure	15 days	Tue 16-01-18	Mon 05-02-18	0%	
400	B6N3 - Chapes	2 days	Mon 22-01-18	Tue 23-01-18	0%	
401	B6N3 - Faux Plafonds Bureaux - Finitions	10 days	Tue 06-02-18	Mon 19-02-18	0%	
402	B6N3 - Faux Plafonds Sanitaires	4 days	Fri 02-02-18	Wed 07-02-18	0%	
403	B6N3 - Carrelages - Sols et Murs	5 days	Thu 08-02-18	Wed 14-02-18	0%	
404	B6N3 - Menuiseries, portes et fenêtres intérieures	5 days	Thu 15-02-18	Wed 21-02-18	0%	
405	B6N3 - Equipements sanitaires	5 days	Thu 22-02-18	Wed 28-02-18	0%	
406	B6N3 - Peinture Propreté	10 days	Thu 01-03-18	Wed 14-03-18	0%	
407	B6N3 - Faux Plancher	4 days	Thu 15-03-18	Tue 20-03-18	0%	
408	B6N3 - Peinture Final + Finitions	8 days	Thu 29-03-18	Fri 06-04-18	0%	
409	B6 - Niveau N4	78 days	Tue 02-01-18	Wed 18-04-18	0%	
410	B6N4 - Maçonneries intérieures	12 days	Tue 02-01-18	Wed 17-01-18	0%	
411	B6N4 - Réseaux Hvac, sanitaire + Réseaux électriques	12 days	Thu 11-01-18	Fri 26-01-18	0%	
412	B6N4 - Plafonnage	12 days	Mon 22-01-18	Tue 06-02-18	0%	
413	B6N4 - Faux Plafonds Bureaux - Structure	15 days	Thu 01-02-18	Wed 21-02-18	0%	
414	B6N4 - Chapes	2 days	Wed 07-02-18	Thu 08-02-18	0%	
415	B6N4 - Faux Plafonds Bureaux - Finitions	10 days	Thu 22-02-18	Wed 07-03-18	0%	
416	B6N4 - Faux Plafonds Sanitaires	4 days	Fri 09-02-18	Wed 14-02-18	0%	
417	B6N4 - Carrelages - Sols et Murs	5 days	Fri 23-02-18	Thu 01-03-18	0%	
418	B6N4 - Menuiseries, portes et fenêtres intérieures	5 days	Fri 02-03-18	Thu 08-03-18	0%	
419	B6N4 - Equipements sanitaires	5 days	Fri 09-03-18	Thu 15-03-18	0%	
420	B6N4 - Peinture Propreté	10 days	Fri 16-03-18	Thu 29-03-18	0%	
421	B6N4 - Faux Plancher	4 days	Fri 30-03-18	Tue 03-04-18	0%	
422	B6N4 - Peinture Final + Finitions	8 days	Mon 09-04-18	Wed 18-04-18	0%	

Tâche	Durée	Début	Fin	ST	%	Points d'attention
B6 - Niveau N5	75 days	Thu 18-01-18	Thu 03-05-18		0%	
B6N5 - Maçonneries intérieures	12 days	Thu 18-01-18	Fri 02-02-18		0%	
B6N5 - Réseaux Hvac, sanitaire + Réseaux électriques	12 days	Mon 29-01-18	Tue 13-02-18		0%	
B6N5 - Plafonnage	12 days	Wed 07-02-18	Thu 22-02-18		0%	
B6N5 - Faux Plafonds Bureaux - Structure	15 days	Mon 19-02-18	Fri 09-03-18		0%	
B6N5 - Chapes	2 days	Fri 23-02-18	Mon 26-02-18		0%	
B6N5 - Faux Plafonds Bureaux - Finitions	10 days	Mon 12-03-18	Fri 23-03-18		0%	
B6N5 - Faux Plafonds Sanitaires	4 days	Tue 27-02-18	Fri 02-03-18		0%	
B6N5 - Carrelages - Sols et Murs	5 days	Tue 13-03-18	Mon 19-03-18		0%	
B6N5 - Menuiseries, portes et fenêtres intérieures	5 days	Tue 20-03-18	Mon 26-03-18		0%	
B6N5 - Equipements sanitaires	5 days	Tue 27-03-18	Sun 01-04-18		0%	
B6N5 - Peinture Propreté	10 days	Mon 02-04-18	Fri 13-04-18		0%	
B6N5 - Faux Plancher	4 days	Mon 16-04-18	Thu 19-04-18		0%	
B6N5 - Peinture Final + Finitions	8 days	Fri 20-04-18	Thu 03-05-18		0%	
B6 - Niveau N6	75 days	Mon 05-02-18	Tue 22-05-18		0%	
B6N6 - Maçonneries intérieures	12 days	Mon 05-02-18	Tue 20-02-18		0%	
B6N6 - Réseaux Hvac, sanitaire + Réseaux électriques	12 days	Wed 14-02-18	Thu 01-03-18		0%	
B6N6 - Plafonnage	12 days	Fri 23-02-18	Mon 12-03-18		0%	
B6N6 - Faux Plafonds Bureaux - Structure	15 days	Wed 07-03-18	Tue 27-03-18		0%	
B6N6 - Chapes	2 days	Tue 13-03-18	Wed 14-03-18		0%	
B6N6 - Faux Plafonds Bureaux - Finitions	10 days	Wed 28-03-18	Mon 09-04-18		0%	
B6N6 - Faux Plafonds Sanitaires	4 days	Thu 15-03-18	Tue 20-03-18		0%	
B6N6 - Carrelages - Sols et Murs	5 days	Thu 29-03-18	Tue 03-04-18		0%	
B6N6 - Menuiseries, portes et fenêtres intérieures	5 days	Wed 04-04-18	Tue 10-04-18		0%	
B6N6 - Equipements sanitaires	5 days	Wed 11-04-18	Tue 17-04-18		0%	
B6N6 - Peinture Propreté	10 days	Wed 18-04-18	Thu 03-05-18		0%	
B6N6 - Faux Plancher	4 days	Fri 04-05-18	Wed 09-05-18		0%	
B6N6 - Peinture Final + Finitions	8 days	Fri 11-05-18	Tue 22-05-18		0%	
B6 - Toiture	25 days	Thu 22-02-18	Wed 28-03-18		0%	
B6TT - Electricité - Toiture - Panneaux solaires	15 days	Thu 22-02-18	Wed 14-03-18		0%	
B6TT - HVAC - Toiture - Groupe froid 243 kW	10 days	Thu 08-03-18	Wed 21-03-18		0%	
B6TT - HVAC - Toiture - Groupe réversible 201 / 203 kW	10 days	Thu 15-03-18	Wed 28-03-18		0%	
B6 - Trémies	50 days	Wed 15-11-17	Thu 01-02-18		0%	
B6 - Hvac - Sanitaire	30 days	Wed 15-11-17	Thu 04-01-18		0%	
B6 - Electricité	30 days	Wed 29-11-17	Thu 18-01-18		0%	
B6 - Vérification trémies	15 days	Fri 05-01-18	Thu 25-01-18		0%	
B6 - Fermeture trémies	15 days	Fri 12-01-18	Thu 01-02-18		0%	
B6 - Commissioning, pré-réception	93 days	Thu 08-03-18	Wed 08-08-18		0%	
B6 - Commissioning installations techniques et mise en service	50 days	Thu 08-03-18	Fri 18-05-18		0%	
B6 - Mise en service des installations techniques B6	0 days	Fri 18-05-18	Fri 18-05-18		0%	
B6 - Soumission du dossier "As-built"	40 days	Thu 08-03-18	Thu 03-05-18		0%	
B6 - Nettoyage final et complet	50 days	Mon 12-03-18	Tue 22-05-18		0%	
B6 - Demande de visite de pré-réception	1 day	Thu 22-03-18	Thu 22-03-18		0%	
B6 - Visite de pré-réception	35 days	Fri 20-04-18	Tue 12-06-18		0%	
B6 - Levée des réserves	35 days	Tue 08-05-18	Tue 26-06-18		0%	
B6 - Demande réception provisoire	1 day	Wed 27-06-18	Wed 27-06-18		0%	
B6 - P.V de pré-réception et d'achèvement du bâtiment B6	0 days	Wed 08-08-18	Wed 08-08-18		0%	
