


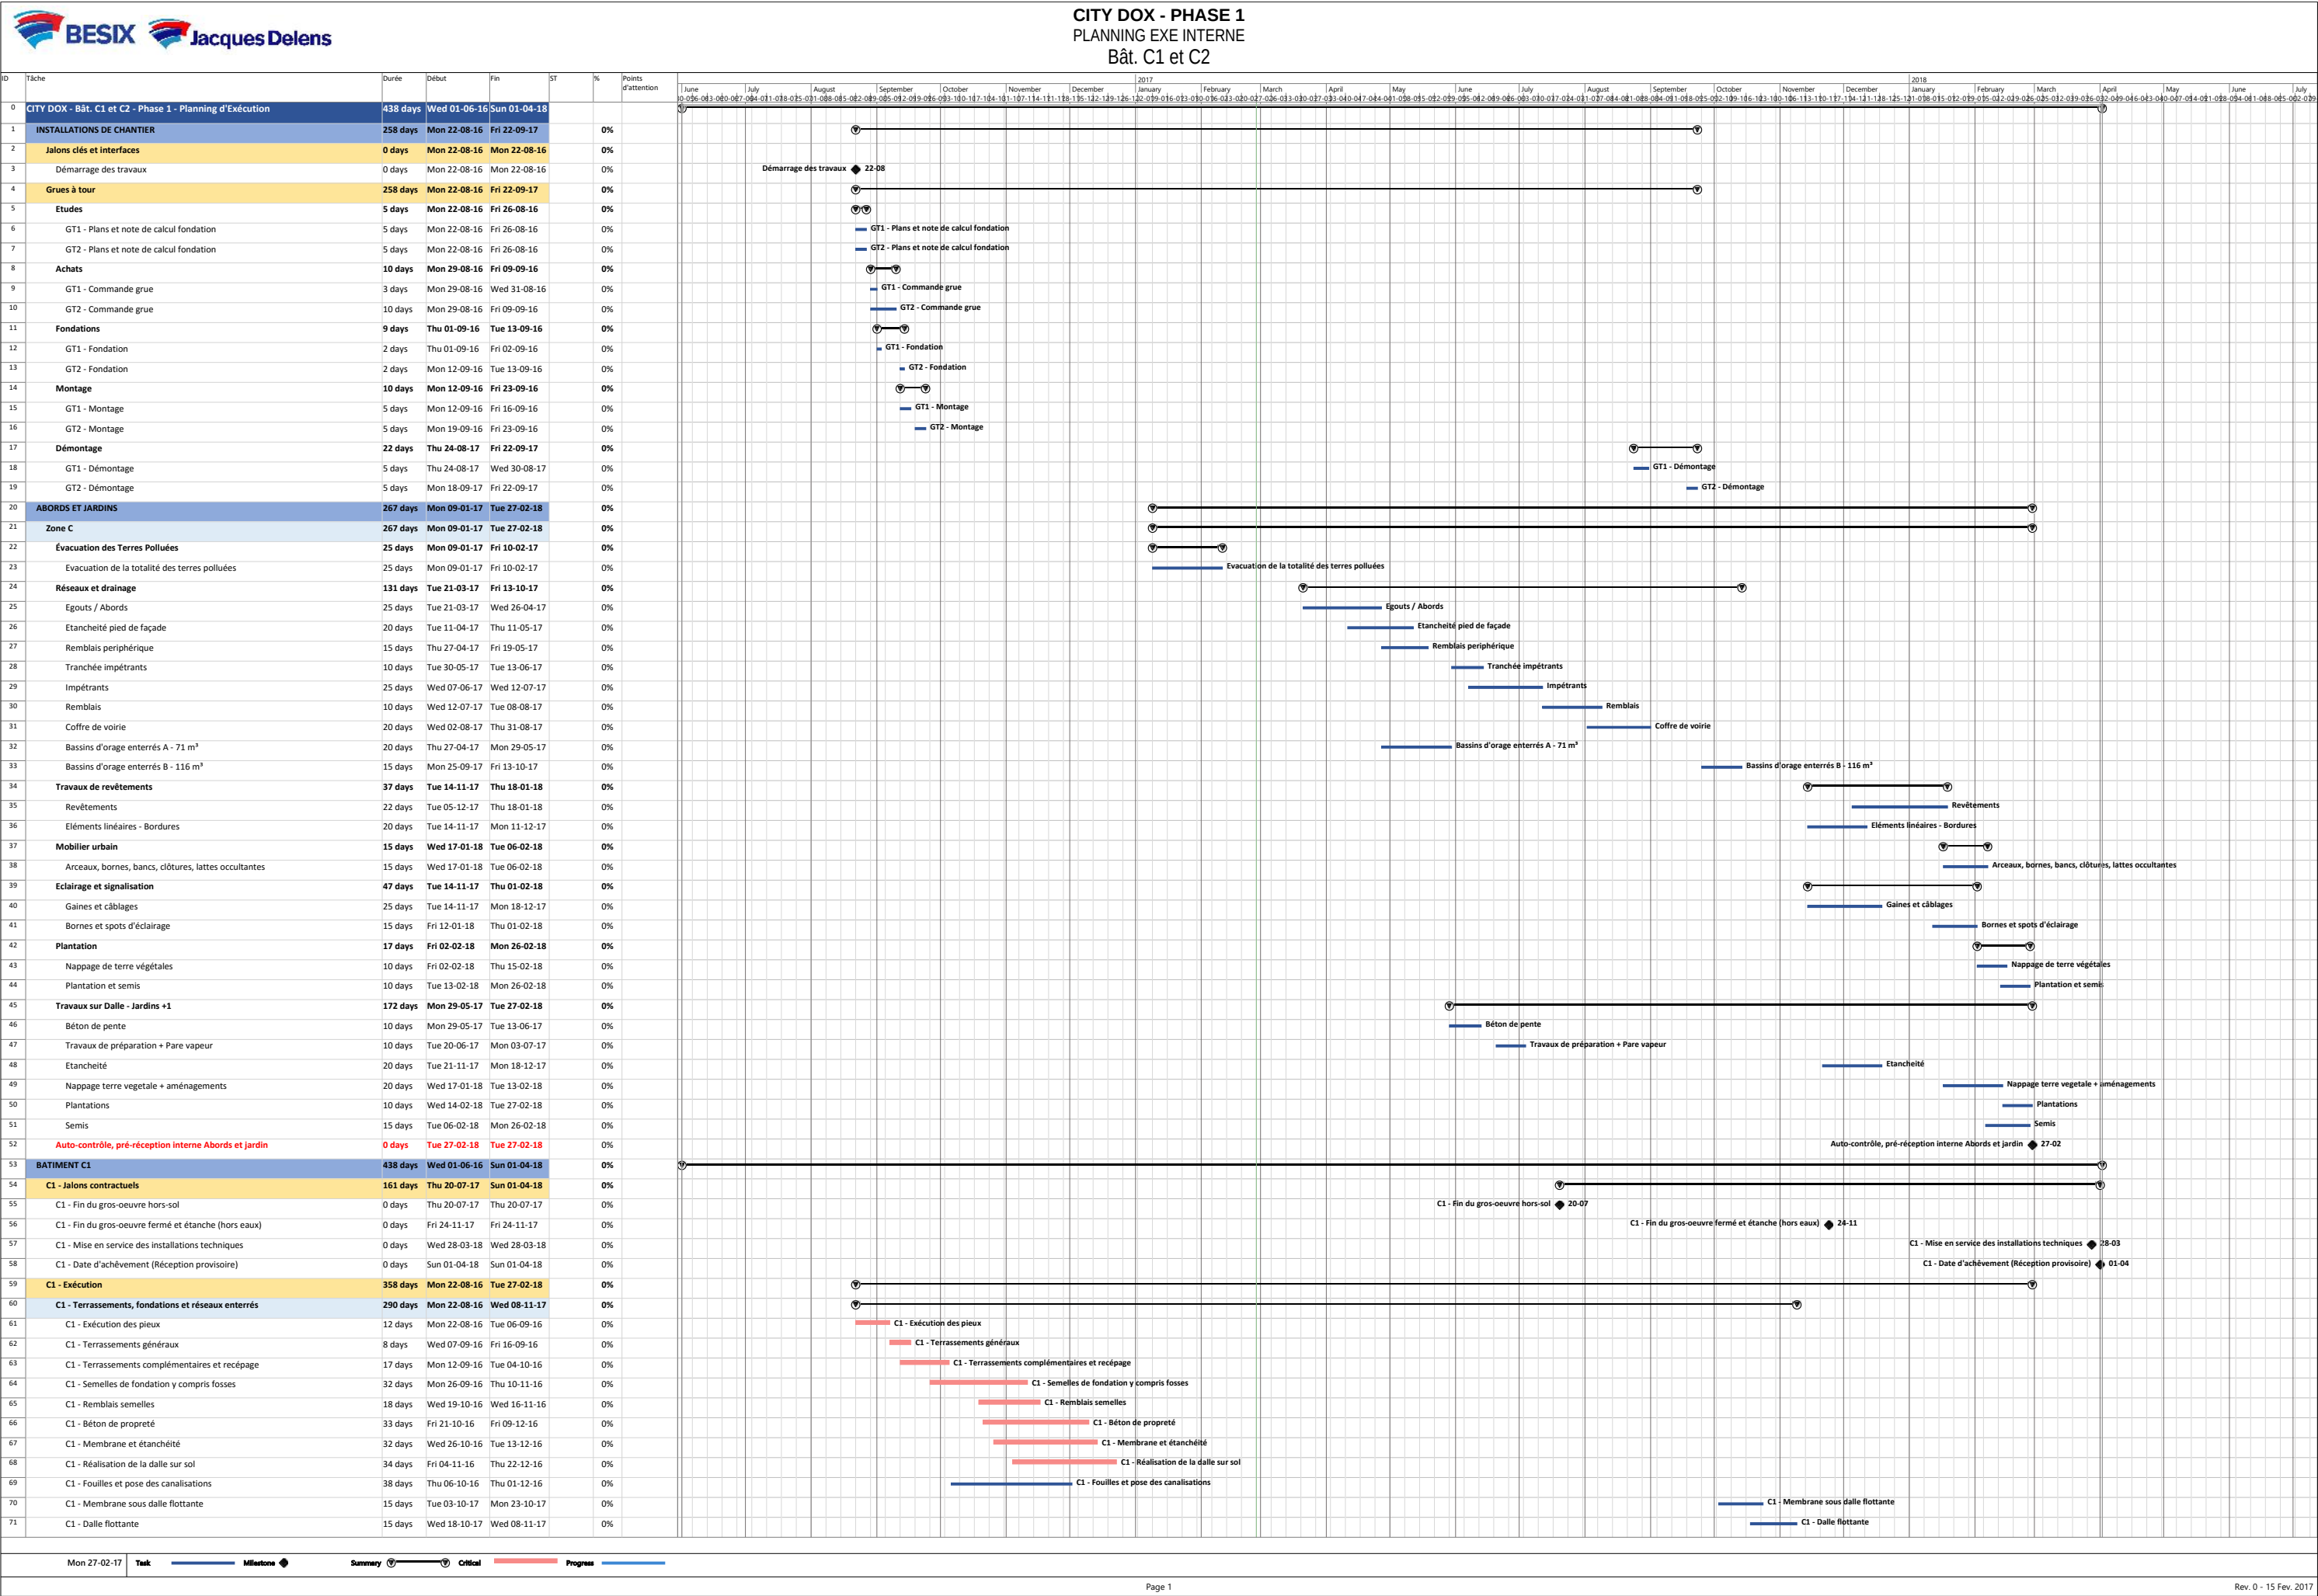

Mon 27-02-17 Task Milestone Summary Critical Progress

Page 2

Rev. 0 - 15 Feb. 2017

CITY DOX - PHASE 1
PLANNING EXE INTERNE
Bât. C1 et C2

Tâche	Durée	Début	Fin	ST	%	Points d'attention
144	C1RC - HVAC - Local chaufferie - 2 x chaudières 225 kW	30 days	Tue 16-05-17	Thu 29-06-17	0%	
145	C1RC - HVAC - Local chaufferie - 2 x réservoirs 2000L	30 days	Wed 21-06-17	Thu 17-08-17	0%	
146	C1RC - Installation Gros Equipements	10 days	Tue 23-05-17	Thu 08-06-17	0%	
147	C1RC - HVAC - Local ventilation - CTA 28610 m3/h	20 days	Thu 10-08-17	Fri 08-09-17	0%	
148	C1RC - HVAC - Local ventilation - Ventilateur axial 5000 m3/h	20 days	Tue 05-09-17	Mon 02-10-17	0%	
149	C1xx - Ascenseur - Local ascenseurs - 1 x monte-charge	30 days	Tue 11-07-17	Wed 06-09-17	0%	
150	C1xx - Ascenseur - Local ascenseurs - 3 x Ascenseurs	60 days	Tue 08-08-17	Thu 02-11-17	0%	
151	C1 - Niveau N1	122 days	Mon 27-03-17	Fri 06-10-17	0%	
152	C1N1 - Privatifs	112 days	Mon 27-03-17	Fri 22-09-17	0%	
153	C1N1 - Blocs de Plâtre	10 days	Mon 27-03-17	Fri 07-04-17	0%	
154	C1N1 - Enduits plafond	15 days	Thu 30-03-17	Fri 21-04-17	0%	
155	C1N1 - Plafonnage façade + sas	11 days	Tue 11-04-17	Thu 27-04-17	0%	
156	C1N1 - Cloisons - 1 face	15 days	Wed 19-04-17	Wed 10-05-17	0%	
157	C1N1 - Rails Cloisons coulissantes	10 days	Wed 26-04-17	Wed 10-05-17	0%	
158	C1N1 - TS - Cloisons + Faux plafonds	20 days	Tue 02-05-17	Wed 31-05-17	0%	
159	C1N1 - Chapes	5 days	Mon 29-05-17	Fri 02-06-17	0%	
160	C1N1 - Fermeture Cloisons + Plafonds y compris finitions joints	15 days	Mon 19-06-17	Fri 07-07-17	0%	
161	C1N1 - Carrelages sols et murs	15 days	Thu 29-06-17	Wed 02-08-17	0%	
162	C1N1 - Menuiseries intérieures (y compris porte palier)	10 days	Thu 13-07-17	Wed 09-08-17	0%	
163	C1N1 - Sols souples	10 days	Thu 03-08-17	Fri 18-08-17	0%	
164	C1N1 - Mobilier + Plinthes	5 days	Mon 21-08-17	Fri 25-08-17	0%	
165	C1N1 - Peinture	15 days	Mon 28-08-17	Fri 15-09-17	0%	
166	C1N1 - Equipements TS	10 days	Mon 11-09-17	Fri 22-09-17	0%	
167	C1N1 - Communs	82 days	Mon 29-05-17	Fri 06-10-17	0%	
168	C1N1 - TS - Réseaux Plafonds	18 days	Mon 29-05-17	Thu 22-06-17	0%	
169	C1N1 - TS - Réseaux encastrés	10 days	Fri 09-06-17	Thu 22-06-17	0%	
170	C1N1 - Enduits murs	5 days	Wed 21-06-17	Tue 27-06-17	0%	
171	C1N1 - Chapes	3 days	Wed 28-06-17	Fri 30-06-17	0%	
172	C1N1 - Faux plafonds	10 days	Mon 03-07-17	Fri 14-07-17	0%	
173	C1N1 - Carrelages	5 days	Thu 03-08-17	Wed 09-08-17	0%	
174	C1N1 - Peintures - Phase 1	5 days	Thu 10-08-17	Fri 18-08-17	0%	
175	C1N1 - Menuiseries + Plinthes - Mains Courantes	10 days	Mon 21-08-17	Fri 01-09-17	0%	
176	C1N1 - Sols souples	5 days	Mon 04-09-17	Fri 08-09-17	0%	
177	C1N1 - Peintures Finales	5 days	Mon 18-09-17	Fri 22-09-17	0%	
178	C1N1 - Equipements TS	10 days	Mon 25-09-17	Fri 06-10-17	0%	
179	C1 - Niveau N2	127 days	Mon 10-04-17	Fri 27-10-17	0%	
180	C1N2 - Privatifs	117 days	Mon 10-04-17	Fri 13-10-17	0%	
181	C1N2 - Blocs de Plâtre	10 days	Mon 10-04-17	Tue 25-04-17	0%	
182	C1N2 - Enduits plafond	15 days	Thu 13-04-17	Mon 08-05-17	0%	
183	C1N2 - Plafonnage façade + sas	15 days	Fri 28-04-17	Fri 19-05-17	0%	
184	C1N2 - Cloisons - 1 face	15 days	Thu 11-05-17	Fri 02-06-17	0%	
185	C1N2 - Rails Cloisons coulissantes	10 days	Thu 18-05-17	Fri 02-06-17	0%	
186	C1N2 - TS - Cloisons + Faux plafonds	20 days	Tue 23-05-17	Thu 22-06-17	0%	
187	C1N2 - Chapes	5 days	Tue 20-06-17	Mon 26-06-17	0%	
188	C1N2 - Fermeture Cloisons + Plafonds y compris finitions joints	15 days	Mon 10-07-17	Fri 11-08-17	0%	
189	C1N2 - Carrelages sols et murs	15 days	Thu 03-08-17	Fri 25-08-17	0%	
190	C1N2 - Menuiseries intérieures (y compris porte palier)	10 days	Mon 21-08-17	Fri 01-09-17	0%	
191	C1N2 - Sols souples	10 days	Mon 28-08-17	Fri 08-09-17	0%	
192	C1N2 - Mobilier + Plinthes	5 days	Mon 11-09-17	Fri 15-09-17	0%	
193	C1N2 - Peinture	15 days	Mon 18-09-17	Fri 06-10-17	0%	
194	C1N2 - Equipements TS	10 days	Mon 02-10-17	Fri 13-10-17	0%	
195	C1N2 - Communs	82 days	Tue 20-06-17	Fri 27-10-17	0%	
196	C1N2 - TS - Réseaux Plafonds	18 days	Fri 23-06-17	Tue 01-08-17	0%	
197	C1N2 - TS - Réseaux encastrés	10 days	Wed 05-07-17	Tue 01-08-17	0%	
198	C1N2 - Enduits murs	5 days	Tue 20-06-17	Mon 26-06-17	0%	
199	C1N2 - Chapes	3 days	Tue 27-06-17	Thu 29-06-17	0%	
200	C1N2 - Faux plafonds	10 days	Fri 30-06-17	Thu 13-07-17	0%	
201	C1N2 - Carrelages	5 days	Mon 28-08-17	Fri 01-09-17	0%	
202	C1N2 - Peintures - Phase 1	5 days	Mon 04-09-17	Fri 08-09-17	0%	
203	C1N2 - Menuiseries + Plinthes - Mains Courantes	10 days	Mon 11-09-17	Fri 22-09-17	0%	
204	C1N2 - Sols souples	5 days	Mon 25-09-17	Fri 29-09-17	0%	
205	C1N2 - Peintures Finales	5 days	Mon 09-10-17	Fri 13-10-17	0%	
206	C1N2 - Equipements TS	10 days	Mon 16-10-17	Fri 27-10-17	0%	
207	C1 - Niveau N3	137 days	Wed 26-04-17	Mon 27-11-17	0%	
208	C1N3 - Privatifs	127 days	Wed 26-04-17	Mon 13-11-17	0%	
209	C1N3 - Blocs de Plâtre	10 days	Wed 26-04-17	Wed 10-05-17	0%	
210	C1N3 - Enduits plafond	15 days	Tue 02-05-17	Mon 22-05-17	0%	
211	C1N3 - Plafonnage façade + sas	15 days	Mon 22-05-17	Wed 14-06-17	0%	
212	C1N3 - Cloisons - 1 face	15 days	Tue 06-06-17	Mon 26-06-17	0%	
213	C1N3 - Rails Cloisons coulissantes	10 days	Tue 13-06-17	Mon 26-06-17	0%	
214	C1N3 - TS - Cloisons + Faux plafonds	20 days	Fri 16-06-17	Thu 13-07-17	0%	
215	C1N3 - Chapes	5 days	Tue 11-07-17	Mon 31-07-17	0%	

Le diagramme de Gantt illustre le planning de construction pour les lots C1N3, C1N4 et C1N5. Les tâches sont représentées par des barres horizontales colorées (bleu pour les tâches principales, rouge pour les tâches de finition) et sont hiérarchisées par indentation. Des symboles de jalons (V) sont placés à des points clés du calendrier. Les tâches sont listées dans l'ordre chronologique de leur début.

Lot C1N3 - Fermeture Cloisons + Plafonds y compris finitions joints

- C1N3 - Carrelages sols et murs
- C1N3 - Menuiseries intérieures (y compris porte palier)
- C1N3 - Sols souples
- C1N3 - Mobilier + Plinthes
- C1N3 - Peinture
- C1N3 - Equipements TS
- C1N3 - TS - Réseaux Plafonds
- C1N3 - TS - Réseaux encastrés
- C1N3 - Enduits murs
- C1N3 - Chapes
- C1N3 - Faux plafonds
- C1N3 - Carrelages
- C1N3 - Peintures - Phase 1
- C1N3 - Menuiseries + Plinthes - Mains Courantes
- C1N3 - Sols souples
- C1N3 - Peintures Finales
- C1N3 - Equipements TS

Lot C1N4 - Blocs de Plâtre

- C1N4 - Enduits plafond
- C1N4 - Plafonnage façade + sas
- C1N4 - Cloisons - 1 face
- C1N4 - Rails Cloisons coulissantes
- C1N4 - TS - Cloisons + Faux plafonds
- C1N4 - Chapes
- C1N4 - Fermeture Cloisons + Plafonds y compris finitions joints
- C1N4 - Carrelages sols et murs
- C1N4 - Menuiseries intérieures (y compris porte palier)
- C1N4 - Sols souples
- C1N4 - Mobilier + Plinthes
- C1N4 - Peinture
- C1N4 - Equipements TS
- C1N4 - TS - Réseaux Plafonds
- C1N4 - TS - Réseaux encastrés
- C1N4 - Enduits murs
- C1N4 - Chapes
- C1N4 - Faux plafonds
- C1N4 - Carrelages
- C1N4 - Peintures - Phase 1
- C1N4 - Menuiseries + Plinthes - Mains Courantes
- C1N4 - Sols souples
- C1N4 - Peintures Finales
- C1N4 - Equipements TS

Lot C1N5 - Blocs de Plâtre

- C1N5 - Enduits plafond
- C1N5 - Plafonnage façade + sas
- C1N5 - Cloisons - 1 face
- C1N5 - Rails Cloisons coulissantes
- C1N5 - TS - Cloisons + Faux plafonds
- C1N5 - Chapes
- C1N5 - Fermeture Cloisons + Plafonds y compris finitions joints
- C1N5 - Carrelages sols et murs
- C1N5 - Menuiseries intérieures (y compris porte palier)
- C1N5 - Sols souples
- C1N5 - Mobilier + Plinthes
- C1N5 - Peinture
- C1N5 - Equipements TS
- C1N5 - TS - Réseaux Plafonds
- C1N5 - TS - Réseaux encastrés
- C1N5 - Enduits murs
- C1N5 - Chapes
- C1N5 - Faux plafonds
- C1N5 - Carrelages
- C1N5 - Peintures - Phase 1
- C1N5 - Menuiseries + Plinthes - Mains Courantes

CIN6 - Blocs de Plâtre

CIN6 - Enduits plafond

CIN6 - Plafonnage façade + sas

CIN6 - Cloisons - 1 face

CIN6 - Rails Cloisons coulissantes

CIN6 - TS - Cloisons + Faux plafonds

CIN6 - Chapes

CIN6 - Fermeture Cloisons + Plafonds y compris finitions joints

CIN6 - Carrelages sols et murs

CIN6 - Menuiseries intérieures (y compris porte palier)

CIN6 - Sols souples

CIN6 - Mobilier + Plinthes

CIN6 - Peinture

CIN6 - Equipements TS

CIN6 - TS - Réseaux Plafonds

CIN6 - TS - Réseaux encastrés

CIN6 - Enduits murs

CIN6 - Chapes

CIN6 - Faux plafonds

CIN6 - Carrelages

CIN6 - Peintures - Phase 1

CIN6 - Menuiseries + Plinthes - Mains Courantes

CIN6 - Sols souples

CIN6 - Peintures Finales

CIN6 - Equipements TS

CIN7 - Blocs de Plâtre

CIN7 - Enduits plafond

CIN7 - Plafonnage façade + sas

CIN7 - Cloisons - 1 face

CIN7 - Rails Cloisons coulissantes

CIN7 - TS - Cloisons + Faux plafonds

CIN7 - Chapes

CIN7 - Fermeture Cloisons + Plafonds y compris finitions joints

CIN7 - Carrelages sols et murs

CIN7 - Menuiseries intérieures (y compris porte palier)

CIN7 - Sols souples

CIN7 - Mobilier + Plinthes

CIN7 - Peinture

CIN7 - Equipements TS

CIN7 - TS - Réseaux Plafonds

CIN7 - TS - Réseaux encastrés

CIN7 - Enduits murs

CIN7 - Chapes

CIN7 - Faux plafonds

CIN7 - Carrelages

CIN7 - Peintures - Phase 1

CIN7 - Menuiseries + Plinthes - Mains Courantes

CIN7 - Sols souples

CIN7 - Peintures Finales

CIN7 - Equipements TS

C1 - Hvac - Sanitaire

C1 - Electricité

C1 - Vérification trémies

C1 - Fermeture trémies

C1 - Hvac - Sanitaire - N+1 au N+3


C1 - Fermeture trémies - N+1 au N+3

C1 - Hvac - Sanitaire - N+4 au N+7

C1 - Vérification trémies - N+4 au N+7

C1 - Fermeture trémies - N+4 au N+7

Mon 27-02-17 Task Milestone Summary Critical Progress

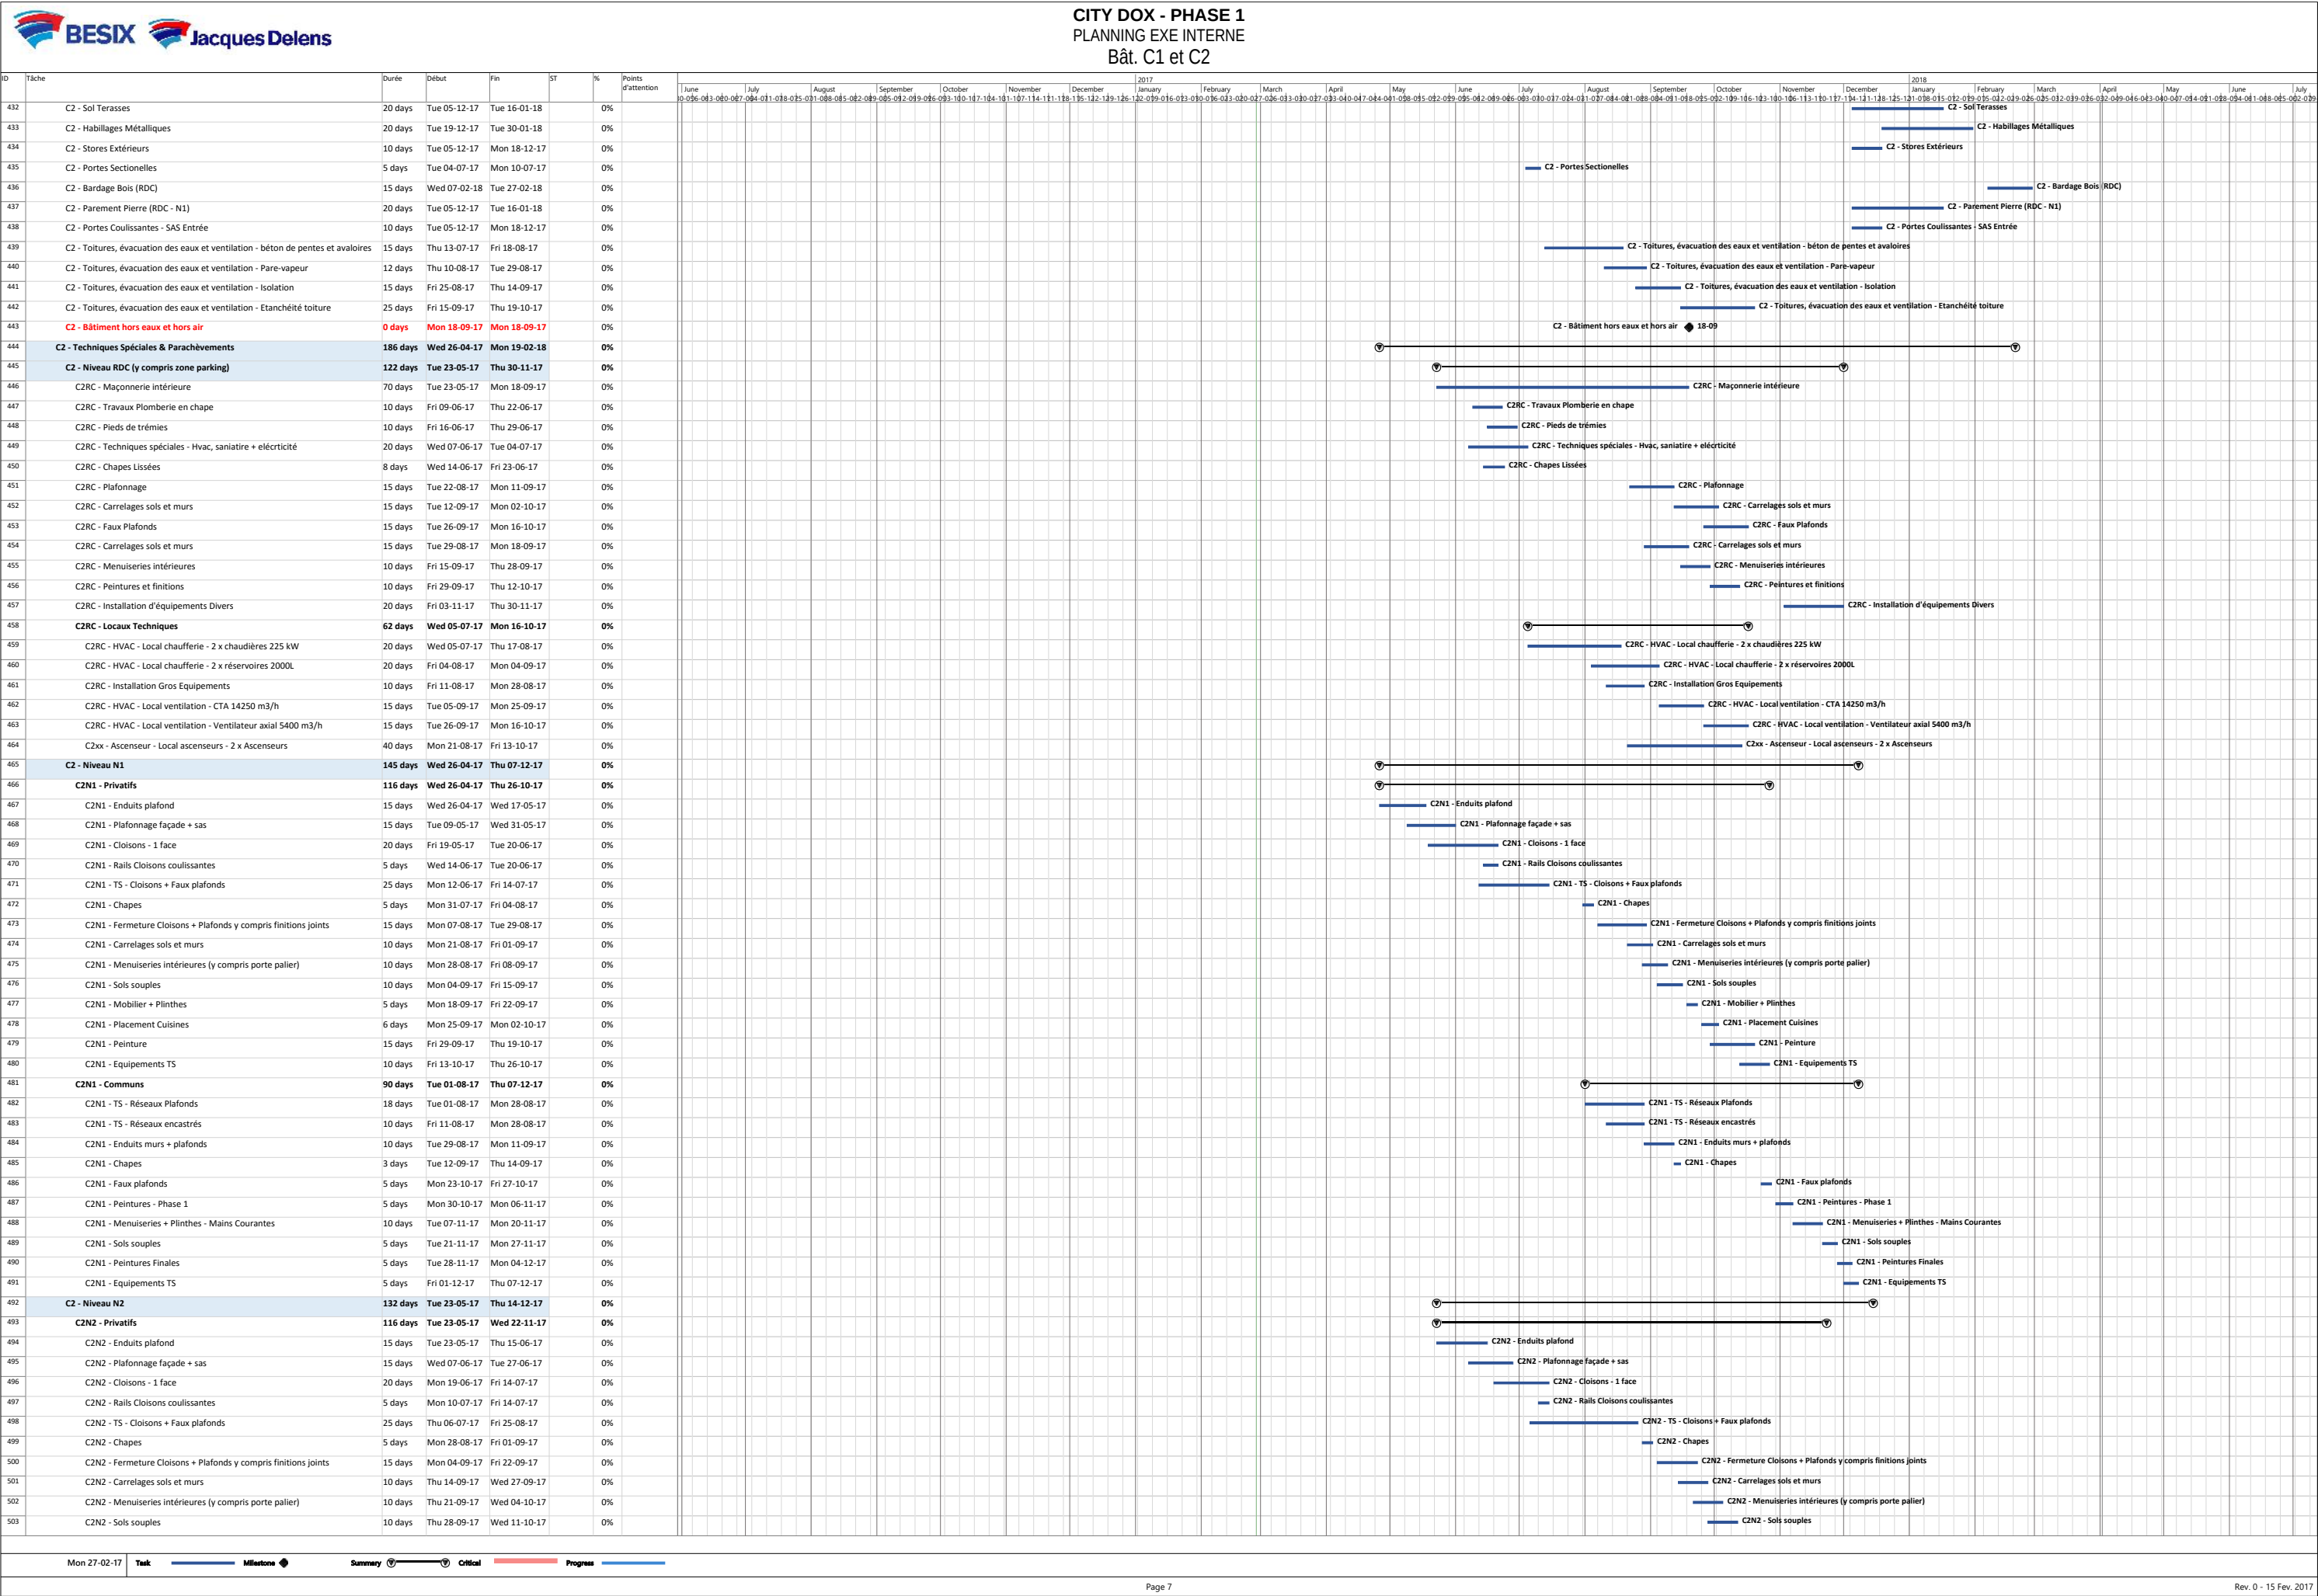

Mon 27-02-17 Task Milestones Summary Critical Progress Page 8 Rev. 0 - 15 Feb. 2017

Mon 27-02-17 Task Milestone Summary Critical Progress Page 9 Rev. 0 - 15 Feb. 2017

Tâche	Durée	Début	Fin	ST	%	Points d'attention
C2 - Levée des réserves	40 days	Tue 16-01-18	Mon 12-03-18		0%	
Demande de réception provisoire	0 days	Mon 12-03-18	Mon 12-03-18		0%	
C2 - P.V de pré-réception et d'achèvement du bâtiment C2	0 days	Sun 01-04-18	Sun 01-04-18		0%	
